

제205회 임시회
(2014.10.23~11.4)

제41대 이흥기 군수

공약사업 실현 계획



거창군

목 차

I. 민선 6기 군정 철학	5
II. 군정목표 및 군정지표	7
III. 실천전략	9
IV. 공약사업 분류	10
V. 공약사업 관리 체계	13
VI-1. 공약사업 목록(분야별)	14
VI-2. 공약사업 목록(부서별).....	17
VII. 분야별·연차별 자원조달.....	20
VIII. 공약사업 관리 지표	22
IX. 공약사업 추진 로드맵	27
X. 분야별 세부추진계획	31

I. 민선 6기 군정철학

“ 우리 거창군을 따뜻한 향기와 온기가 있는 집처럼 만들고 싶다”

- 2014.7.1 이흥기 군수 취임사 모두 발언 중 -

취임사 중

존경하는 군민 여러분 !

민선 5기가 거창의 내일로 가는 큰 밑그림을 그리고
하드웨어 구축에 치중한 창조도시 1기였다면

민선 6기는 그 토대위에 소프트웨어를 채워 넣고
거창의 가치를 재 창출 해야 할 창조도시 2기로서
사회적자본 축적에 주력 할 시기로 진단하고 있습니다.

신뢰와 배려, 참여와 소통, 협력을 바탕으로
사회의 건강성과 생산성을 높여주는 사회적자본은
양적 성장사회에서 질적 성숙사회로 나아가는데
반드시 필요한 미래지향의 시대정신입니다.

이러한 군정 운영 기초를 바탕으로
예산 5천억원 시대를 열어 가면서
공약사업을 비롯한 중장기 과제들을 알차게 이행하고

한편으로는 우리 모두가 알면서도 지금까지 외면해 온
비정상적 사회병리를 정상화 하면서 우리 거창의
큰 물줄기를 바꾸는 대 변혁을 시도해 보고자 합니다.

저는 민선 6기 출범과 함께

군민이 주도하는 거창,

기본이 바로 선 거창,

하나의 공동체 거창 을

3대 지표를 사회적 대 의제로 제시하고자 합니다.

먼저, 군민이 주도하는 거창은 지금까지 이어져 온 행정의 패러다임을 근본적으로 바꾸자는 것입니다.

군정의 추진주체를 행정 주도에서 민간주도로 바꾸고 추진방향도 행정편의에서 실질적 주민편의로 가겠다는 것입니다.

군민이 주도적으로 거창발전에 필요한 일들을 제안하고 행정은 이를 정책화 하여 제도적, 재정적 뒷받침을 하면서

군정의 모든 영역에서 이 같은 흐름이 일반화 될 때 비로소 진정한 주민자치가 정착 되었다 할 것입니다.

두 번째, 기본이 바로 선 거창을 위해서는 뿌리 깊은 무질서·무책임·무조건의 3無를 타파하여 과거지향의 퇴행적 관성에서 벗어나자는 것입니다.

세 번째, 하나의 공동체 거창은 불평등·불합리·부패의 3불 없는 거창을 만들자는 것이며

군민의 상대적 삶의 질의 격차를 줄이면서 제도적, 행태적 불합리를 규제개선 차원에서 걷어내고

공직사회를 비롯하여 곳곳에 숨어있는 부패요소도 깨끗이 털어내자는 것입니다.

무엇보다 중요한 전제요건은 군민적 참여와 실천의지이며 사회적 합의와 기득권을 포기할 용기도 필요하다는 것을 호소합니다.

앞으로 이러한 패러다임의 변화를 시도하는 과정에서 불가피한 반작용이 나타나고 비난이 쏟아질 수도 있겠지만 그 무엇보다 가치 있는 도전이라는 점에서 기꺼이 감수 할 것입니다.

II. 군정목표 및 군정지표

군정목표

네밀의 도시 창조 거창

더 잘사는 농업경제
더 따뜻한 체감복지
더 앞서는 으뜸교육
더 큰매력 문화관광
더 든든한 안전행정

거창  거창

군정 비전

네밀의 도시 창조거창

민선 5기 군정철학을 발전적으로 계승하고 민선 6기를 통하여 군정의 각 영역에서 '대한민국 톱 10 자치단체'로 올라서게 될 『**창조도시 거창**』의 완성된 미래상을 함축적으로 표현

군정 목표

더 잘사는 농업경제

농업 총 생산 5천억 시대를 열면서 3천만원 소득 5천 농가 육성 등을 통한 농업인의 중산층 확대로 3農(농업인·농업·농촌) 행복농정 실현과 거창스타일 마을 만들기, 승강기산업 글로벌 육성, 법조타운 조성, 에너지 자립도시 실현 등으로 지속가능 성장의 기반을 마련 함

더 따뜻한 체감복지

사회취약 계층에 대한 배려 확대와 복지 사각 지대 최소화에 주력하면서 여성 친화도시, WHO 건강도시 지정 등을 통하여 군민의 행복총량을 높여서 모두가 골고루 따뜻함을 누리는 지역사회를 만들어 가고자 함

더 앞서는 으뜸 교육

아카데미파크 조성 and 평생교육·고용 연계형 직업교육원 설치 등으로 다른 지역이 흉내 낼수 없는 명품 교육도시 환경으로 업그레이드 하면서 교육도시 차원을 넘어 지식복지도시로 나아가고자 함

더 큰매력 문화관광

거창 창포원, 빼제 산림레포츠 파크, 향 노화 힐링랜드를 비롯한 매력적 문화관광 인프라를 획기적으로 확충, 융합산업화 함으로써 주민 소득원 창출과 유동인구 증가 등의 시너지효과 창출

더 든든한 안전행정

WHO 국제안전도시 인증 획득, 안전관리 통합계획 수립 등으로 군민 생활을 든든하게 지켜주고 군민이 안심하는 도시환경 구축

Ⅲ. 2020년 거창군 비전을 위한 실천전략

2020년 거창군	대한민국 TOP10 자치단체
	지식복지도시
	여성친화도시
	건강도시
	우주천문문화도시
	국제안전도시
실천 전략	• 농업생산 3천만원 이상 농가 5천농가 육성
	• 구석구석 맞춤형 생활복지
	• 교육도시를 넘어 지식복지도시로 진화
	• 문화·체육·관광을 융합한 미래산업 육성
	• 안정적 지역경제성장 기반조성
	• 에너지 자립도시 완성
	• 경쟁력 있는 도시환경의 재창조
	• 소통과 협업의 행정

IV. 공약사업 분류

분야별

계	농정	보건 복지	교육	문광 체육	경제	지역 개발	도시 환경	일반 행정
66건	9	13	5	9	9	12	7	2

성격별

계		예산(사업성)			비예산(시책성)			
계	신규	계속	소계	신규	계속	소계	신규	계속
66건	29	37	66	29	37	-	-	-

주관 부서별

계	기 획 감사실	주민생활 지 원 실	창 조 산 업 과	재 무 과	안 전 총 괄 과	승 강 기 경 제 과	문 화 관 광 과	산 림 녹 지 과
66건	1	9	10	1	4	4	1	3
	녹 색 환 경 과	건 설 과	도 시 건 축 과	농 업 기 술 센 터	보 건 소		상 하 수 도 사 업 소	체 청 사 업 소
	3	7	5	10	3	2	3	

공약완료 소요기간별

계	임 기 내					임기 이후 (장 기)
	소계	단 기	중 기			
		2015	2016	2017	2018	
66건	59	17	11	11	20	7

사업규모별

계	1억원 미만	1억이상 ~ 10억미만	10억 ~ 50억	50억 ~ 100억	100억 ~ 500억	500억 ~ 1000억	1천억 이상~	비예산
66	3	13	16	9	18	3	4	0

□ **재원 및 연도별 투자계획**

- 총 사업비(백만원) : 7,178,409
 - ┌ **자체 공약사업비** : **1,250,209**
 - └ **국책사업(함양~울산 고속도로/남부우회도로)** : 5,928,200
- (단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내				임기 이후	
			소계	2015	2016	2017		2018
계	1,250,209	189,990	975,384	356,376	297,243	204,987	116,778	84,835
국 비	577,854	94,516	422,848	103,550	297,243	204,987	116,778	60,490
도 비	100,400	7,328	81,652	26,435	153,221	112,189	53,888	11,419
군 비	350,990	81,232	256,732	110,348	21,675	19,531	14,012	12,326
민자등	220,965	6,914	213,451	116,043	67,145	49,648	30,291	600

※ 함양~울산간 고속도로 조기착공 및 거창 남부우회도로 건설 : 국책사업이므로 재원계획에서 분리

□ **타 후보자 및 시민사회단체 제안 채택 : 18건**

- **군수 공약으로 제시(채택) : 12건**
- **일반 시책화를 통한 군정 반영 : 6건**

양동인 후보자 제시 공약 : 5건

- ◇ 시니어클럽 기능 강화 : 군수 공약으로 제시
 - ◇ 택시 감차계획 추진 : 군수 공약으로 제시
 - ◇ 대도시권 농축산물 판매망 확충 : 군수 공약으로 제시
 ⇒ 대도시 거창로컬푸드 직매장 설치 공약으로 제시
 - ◇ 농기계 임대사업 확대 : 군수 공약으로 기 제시
 - ◇ 산부인과 개원(기 실현) : 산후 조리원 설치 공약 제시
-
- ◇ 대도시권 유휴인력 농번기 활용(기 시행 중)
 - ◇ 화물자동차 공영차고지 조성(기 추진 중)
 - ◇ 보훈회관 신축(민선 5기 공약)

백신종 후보자 제시 공약 : 2건

- ◇ 장애인 종합복지관 건립 : 군수 공약으로 제시
- ◇ 마을 주도 도랑 살리기 : 군수 공약으로 제시
- ◇ 화물자동차 공영차고지 조성(기 추진 중)

거창 참여자치 유권자 연대 : 4건

- ◇ 주민의 의정활동 참여기회 제공
 - 의정활동 및 군정 간부회의 인터넷 중계 : 일부 반영
 - ※ 의정활동은 기관을 달리 하므로 의회의 입장 정리가 전제조건임
- ◇ 장애인 주간 보호시설 설치 : 군수 공약으로 제시
- ◇ 장애인 복지기관 건립: 장애인 복합문화관 건립을 공약으로 제시
- ◇ 자활기업 및 사회적 기업 육성
 - 마을 만들기 100개 육성을 공약으로 제시
(사회적기업 육성과 연계되는 시책임)

거창축협 정책제안 : 1건

- ◇ 대도시 축산물 직매장 출점
 - ⇒ 대도시 거창로컬푸드 직매장 설치를 공약으로 제시

기타 정책제안의 군정 반영 : 6건(일반시책화)

【거창군 청소년 참여위원회 청소년 정책 제안】

- ◇ 진로활동 전문가 양성 및 배치
 - ⇒ 거창군 장학회를 통하여 전문적 진로상담 방안을 모색하겠음
- ◇ 대중교통 안내 표지판 설치 : 일반시책으로 추진하겠음
- ◇ 안전한 귀가길 조성
 - ⇒ 신호등 점등시간 조정, 골목길 등 취약지 방범문제 등은 CCTV 통합관제센터와 연계해 보완해 나가겠음
- ◇ 금연구역 표시 및 금연 구역 규제 강화 : 지속적 추진
- ◇ 불법주차 단속 강화 : 수용하고 단속을 강화할 것임
- ◇ 안전한 자전거도로 확보
 - ⇒ 위험구간에 대해 전수 조사 후 단계별 개선방안을 강구하겠음

V. 공약사업 관리 체계

□ 역할 분담

○ 기획감사실

┌ 기획담당 : 실천계획 종합·조정, 분기별 추진도 점검

└ 예산담당 : 총괄적 투자계획, 자원조달 계획 수립

○ 주관부서 : 공약사업 세부 실천계획 수립·시행, 심사자료 제출

○ 공약이행 평가단 : 공약 이행 전반 평가

□ 관리 계획

○ 추진사항 점검·관리 : 분기 1회 추진사항 업데이트

○ 세부 실천계획 반기별 심사·평가 : 연 2회(7월, 12월)

○ 공약사업 실천계획 및 반기별 평가 결과 공개

⇒ 매니페스토(Manifesto) 정신에 부응한 대 국민 신뢰성 확보

○ 공약사업 추진사항 보고회 개최 : 매년 1회


○ 거창군 군수공약 실천 관리 예규 제정

⇒ 공약의 체계적 관리 및 이행에 필요한 제도적 기반 마련

○ 『**군수와의 토크콘서트**』 실시

⇒ 주민, 시민단체 등과 자유소통의 장 마련

□ 관리 체계도

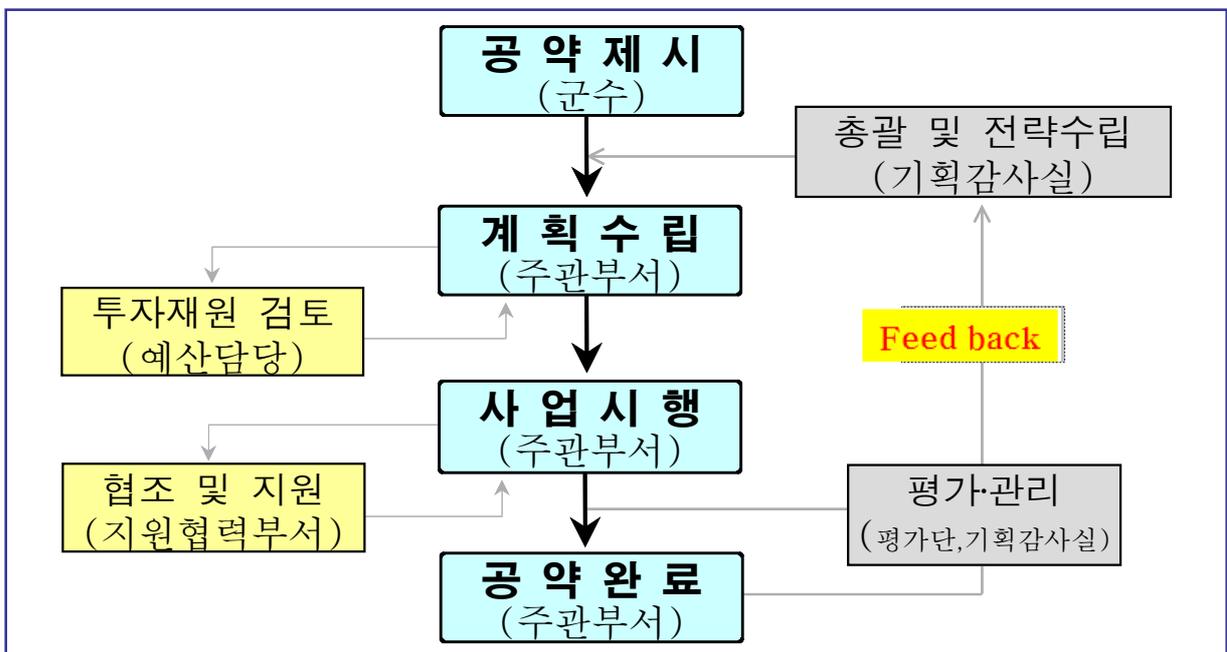

VI-1. 공약사업 목록(분야별)

NO	분야별	사 업 명	사업비 (백만원)	사업 기간
총계	66	총 사업비	7,178,409	
		자체 공약사업	1,250,209	
		국책사업(함양~울산 고속도로 건설/ 거창읍 남부우회도로 건설)	5,928,200	
1-1	농정 (9)	농산물 종합가공 지원센터 건립	2,500	2015
1-2		대도시 농축산물 직매장 개설	3,500	2017
1-3		친환경 한우사료 생산 시설 건립	500	2015
1-4		거창 사과·딸기산업 특구사업 추진	76,994	2017
1-5		친환경 약초·산채산업 육성	12,607	2018
1-6		딸기 유통·가공산업화 육성	3,100	2018
1-7		수출농업 전략적 육성	5,928	2018
1-8		농번기 마을단위 공동급식 지원사업	1,037	2018
1-9		농기계임대사업 권역별 확대 설치	1,400	2016
소계				107,566
2-1	사 회 복 지 (13)	행복 나르미센터 설치	653	2014(계속)
2-2		시니어클럽 일자리 확대	1,550	2014(계속)
2-3		온 세대 한 살림 터 조성	650	2014(계속)
2-4		노인회관 건립	2,000	2016
2-5		장애인 복합문화관 건립	2,500	2016
2-6		장애인 주간 보호시설 설치	200	2016
2-7		여성 친화도시 지정	2,064	2019
2-8		다문화자녀 언어교육 프로그램 도입	290	2018
2-9		다문화가족 취업박람회 개최	120	2018
2-10		산후 조리원 설치	500	2016
2-11		소아과 진료시간 연장 시행	540	2015(계속)
2-12		WHO 건강도시 인증 추진	100	2015
2-13		거창 부르미 택시 도입	1,000	2015(계속)
소계			12,167	

3-1	교육 (5)	지식복지도시 기반 구축	219	2015(계속)
3-2		아카데미파크웨이 조성	17,818	2017년
3-3		전국 평생학습박람회 유치	1,500	2016년
3-4		천문우주문화도시 기반 조성	26,109	2016년
3-5		거창군 평생교육·고용 연계형 직업교육원 설치	15,000	2018년
소계			60,646	

4-1	문화 관광 체육 (9)	거창 창포원 조성	23,036	2016
4-2		국제 웰빙 원예박람회 유치	44,678	2018
4-3		빠재 산림레포츠파크 조성	35,500	2017
4-4		항 노화 힐링랜드 조성	49,800	2018
4-5		아홉산 선화공주 설화 콘텐츠 개발	5,945	2018
4-6		거창군 다목적 실내체육관 건립	28,000	2018
4-7		국민체육센터 볼링장 설치	1,960	2015
4-8		국제 파크골프대회 유치	50	2014
4-9		월성·수송대권 트레킹코스 개설	5,120	2019
소계			194,089	

5-1	경제 (9)	거창승강기 글로벌화 육성	9,800	2016
5-2		승강기전문 농공단지 조성	29,900	2016
5-3		에너지 자립도시 추진	135,415	2018
5-4		에너지 자립마을 육성(10개소)	15,143	2018
5-5		에코 에너지파크 조성	2,578	2015
5-6		거창스타일 마을 만들기(50개)	1,960	2017
5-7		택시 감차계획 추진	1,239	2019
5-8		전통시장 공동물류센터 건립	5,000	2017
5-9		중소기업육성기금 조성	10,000	2018
소계			211,035	

6-1	지역 개발 (12)	거창 법조타운 조기 완공	192,200	2017
6-2		거창읍 북부 우회도로 개설	28,400	2019
6-3		제6교(가칭) 가설	18,300	2019
6-4		현 법조시설 부지 개발계획 수립	50,000	2018
6-5		지방도 남상~가북 구간 조기 완공	68,500	2017
6-6		군도 4호선(병곡~산수) 확포장	4,600	2015
6-7		舊 서흥여객 부지 개발계획 수립	830	2017
6-8		거창 남부 우회도로 개설	42,000	2018
6-9		읍·면 소재지 및 권역별 정비사업 확대	92,620	2018(계속)
6-10		고향의 강 조성사업 조기 완공	23,535	2018
6-11		황강 종합 정비사업	15,086	2015
6-12		함양~울산간 고속도로 조기 착공	5,886,200	2019
소계			6,422,271	

7-1	도시 환경 (7)	거창읍 중앙로(로터리~대동리) 도로환경 정비	4,300	2016
7-2		거창읍 교통체계 개편 및 주차난 해결	760	2018
7-3		거창읍 처리구역 하수관거 정비	6,000	2017
7-4		포켓공원 조성(40개소)	5,120	2017
7-5		88고속도로 거창 관문 조성사업	7,000	2017
7-6		마을 하수도 설치 확대	148,415	2018(계속)
7-7		도랑 살리기 사업(30개소)	1,266	2018
소계			172,861	

8-1	일반	WHO 국제 안전도시 인증 획득	225	2018
8-2	행정	군정회의 인터넷 중계	33	2014(계속)
소계	(2)		258	

VI-2. 공약사업 목록(부서별)

NO	부서별	사 업 명	사업비 (백만원)	사업 기간
총계	66	총 사업비	7,178,409	
		자체 공약사업	1,250,209	
		국책사업(함양~울산 고속도로 건설)	5,928,200	
1	기획감사실 (1)	군정 회의 인터넷 중계	33	
2	주민 생활 지원 실 (9)	행복 나르미센터 설치	653	
3		시니어클럽 일자리 확대	1,550	
4		온 세대 한 살림 터 조성	650	
5		노인회관 건립	2,000	
6		장애인 복합문화관 건립	2,500	
7		장애인 주간 보호시설 설치	200	
8		여성 친화도시 지정	2,064	
9		다문화자녀 언어교육 프로그램 도입	290	
10		다문화가족 취업박람회 개최	120	
11	창 조 산 업 과 (10)	지식복지도시 기반 구축	219	
12		거창 법조타운 조기 완공	192,200	
13		현 법조시설 부지 개발계획 수립	50,000	
14		읍·면 소재지 및 권역별 정비사업 확대	92,620	
15		전국 평생학습박람회 유치	1,500	
16		거창군 평생교육·고용 연계형 직업교육원 설치	15,000	
17		국제 웰빙 원예박람회 유치	44,678	
18		천문우주문화도시 기반 조성	26,109	
19		에너지 자립도시 추진	135,415	
20		에너지 자립마을 육성(10개소)	15,143	

21	재무과 (1)	舊 서흥여객 부지 개발계획 수립	830	
22	안전총괄과 (4)	거창 부르미 택시 도입	1,000	
23		택시 감차계획 추진	1,239	
24		거창읍 교통체계 개편 및 주차난 해결	760	
25		WHO 국제 안전도시 인증 획득	225	
26	승강기 경제과 (4)	승강기전문 농공단지 조성	29,900	
27		거창승강기 글로벌화 육성	9,800	
29		전통시장 공동물류센터 건립	5,000	
30		중소기업 육성기금 조성	10,000	
31	문화관광과 (1)	아홉산 선화공주 설화 콘텐츠 개발	5,945	
32	산림녹지과 (3)	포켓공원 조성(40개소)	5,120	
33		빼재 산림레포츠파크 조성	35,500	
34		항 노화 힐링랜드 조성	49,800	
35	녹색환경과 (3)	거창 창포원 조성	23,036	
36		도랑 살리기 사업(30개소)	1,266	
37		에코 에너지파크 조성	2,578	
38	건설과 (7)	거창 남부 우회도로 개설	42,000	
39		지방도 남상~가북 구간 조기 완공	68,500	
40		군도 4호선(병곡~산수) 확포장	4,600	
41		고향의 강 조성사업 조기 완공	23,535	
42		88고속도로 거창 관문 조성사업	7,000	
43		황강 종합 정비사업	15,086	
44		함양~울산간 고속도로 조기 착공	5,886,200	
45	도시건축과 (5)	거창읍 북부 우회도로 개설	28,400	
46		제6교(가칭) 가설	18,300	
47		월성·수승대권 트레킹코스 개설	5,120	
48		거창읍 중앙로(로터리~대동리) 도로환경 정비	4,300	
49		아카데미 파크웨이 조성	17,818	

50	농업 기술 센터 (10)	농산물 종합가공 지원센터 건립	2,500	
51		대도시 거창 농축산물 직매장 설치	3,500	
52		친환경 한우사료 생산 시설 건립	500	
53		거창 사과·딸기산업 특구사업 추진	76,994	
54		친환경 약초·산채산업 육성	12,607	
55		딸기 유통·가공산업화 육성	3,100	
56		수출농업 전략적 육성	5,928	
57		농번기 마을단위 공동급식 지원사업	1,037	
58		농기계임대사업 권역별 확대 설치	1,400	
			거창 맞춤형 마을만들기(50개소)	1,960
59	보건소 (3)	산후 조리원 설치	500	
60		소아과 진료시간 연장 시행	540	
61		WHO 건강도시 인증 추진	100	
62	상하수도 사업소 (2)	거창읍 처리구역 하수관거 정비	6,000	
63		마을 하수도 설치 확대	148,415	
64	체육청소년 사업소 (3)	거창군 다목적 실내체육관 건립	28,000	
65		국민체육센터 볼링장 설치	1,960	
66		국제 파크골프대회 유치	50	

VII. 분야별·연차별 재원조달

1. 농업분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	임기 이후
계	107,566	17,559	18,275	21,334	24,016	19,527	3,205	
국 비	16,416	2,751	2,666	3,281	3,926	2,792	375	
도 비	14,601	2,107	2,193	2,417	2,531	2,417	450	300
군 비	43,866	6,970	7,342	9,062	10,460	7,442	1,130	300
민자 등	32,683	5,731	6,074	6,574	7,099	6,876	1,250	600

2. 사회복지분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	임기 이후
계	12,167	342	1,978	3,875	2,215	1,627	1,430	700
국 비	1,105	32	73	1,000	-	-	-	-
도 비	1,500	-	1,000	500	-	-	-	
군 비	9,242	280	885	2,365	1,995	1,607	1,410	700
민자 등	320	30	20	10	220	20	20	-

3. 교육분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기 이후
계	60,646	4,000	2,681	12,733	32,893	5,839	2,500
국 비	8,688	1,850	450	3,447	2,282	659	0
도 비	4,743	0	0	1,542	1,942	1,259	0
군 비	9,715	2,150	731	2,444	2,569	1,621	200
민자 등	37,500	0	1,500	5300	26,100	2,300	2,300

4. 문화·체육·관광분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기 이후
계	211,035	16,981	47,548	66,900	36,169	22,787	20,450
국 비	32,906	7,719	4,960	4,053	7,882	4,146	4,146
도 비	4,911	570	627	1262	2,062	195	195
군 비	35,433	7,539	3,021	6,116	6,442	7,023	5,092
민자 등	137,785	1,153	38,940	55,469	19,783	11,423	11,017

5. 경제분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기이후
계	211,035	16,981	47,548	66,900	36,169	22,787	20,450
국 비	32,906	7,719	4,960	4,053	7,882	4,146	4,146
도 비	4,911	570	627	1,262	2,062	195	195
군 비	35,433	7,539	3,021	6,116	6,442	7,023	5,092
민자 등	137,785	1,153	38,940	55,469	19,783	11,423	11,017

6. 지역개발분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기이후
계	6,422,271	286,088	119,697	929,946	1,347,044	1,307,649	1,232,147
국 비	62,50,196	233,416	91,878	893,694	1,321,029	1,290,444	1,220,035
도 비	31,202	2,832	5,603	5,104	5,699	6,456	5,508
군 비	140,873	49,840	22,216	31,148	20,316	10,749	6,604
민자 등	0	0	0	0	0	0	0

7. 도시환경분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기이후
계	172,861	61,542	3,162	7,654	13,118	10,047	3,209
국 비	117,461	47,950	1,669	2,040	6,506	5,406	2,000
도 비	17,429	1,299	479	976	1,862	1,265	429
군 비	37,971	12,293	1,014	4,638	4,750	3,376	780
민자 등	0	0	0	0	0	0	0

8. 일반행정분야

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	기투자	2014	2015	2016	2017	임기이후
계	257.5	0	112.5	26	31	46	36
국 비	40	0	40	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	217.5	0	72.5	26	31	46	36
민자 등	0	0	0	0	0	0	0

VIII. 공약사업 관리지표

연번	분야	공약사업명	관리지표
1-1	농정 (9)	농산물 종합가공 지원센터 건립	• 농산물 종합가공지원센터 (연면적 1000㎡) 건립 1식
1-2		대도시 농축산물 직매장 개설	• 대도시 직매장 개설 1개소
1-3		친환경 한우사료 생산 시설 건립	• 싹보리 생산 건물(165m) 1식
1-4		거창 사과딸기산업 특구사업 추진	• 2전략, 5과제, 22특화사업 추진
1-5		친환경 약초·산채산업 육성	• 4~5개 작목반 구성 • 120ha 조성
1-6		딸기 유통·가공산업육성	• 딸기가공, 체험 시설 1식 • 거창딸기 유통가공사업 추진단 구성 • 홈페이지 구축
1-7		수출농업 전략적 육성	• 나디아 150농가 100ha조성 • 신품종 전문농장 유치 : 20ha 내외 • NB 사과 시범식재 ; 연4농가 2ha
1-8		농번기 마을단위 공동급식 지원사업	• 150마을 지원
1-9		농기계임대사업 권역별 확대 설치	• 농기계 임대사업소 분소설치 1개소 • 농기계 구입 : 4억
2-1	사회 복지 (13)	행복 나르미센터 설치 운영	• 행복나르미센터 설치 5개소
2-2		시니어클럽 일자리 확대	• 일자리 확대 : 416명 • 공동작업장 3개소→6개소
2-3		온 세대 한 살림 터 조성	• 3~5개소
2-4		노인회관 건립	• 노인회관 건립 1식
2-5		장애인 복합문화관 건립	• 장애인 복합문화관 건립 1식

연번	분야	공약사업명	관리지표
2-6	사회 복지 (13)	장애인 주간 보호시설 설치	• 시설 설치 1식
2-7		여성 친화도시 지정	• 여성친화도시 지정 승인
2-8		다문화자녀 언어교육 프로그램 도입	• 언어발달사 채용 : 5명 • 교육 실시 : 연20명
2-9		다문화가족 취업박람회 개최	• 연1회 박람회 실시
2-10		산후 조리원 설치	• 거창적십자병원 내 1개소
2-11		소아과 진료시간 연장 시행	• 진료시간 연장 : 21시 • 전문의 배치: 2명
2-12		WHO 건강도시 인증 추진	• WHO 건강도시 인증
2-13		거창 부르미 택시 도입	• 조례제정 • 농어촌 버스 미운행지역 및 벽지노선 부르미 택시 운행
3-1	교육 (5)	지식복지도시 기반 구축	• 종합정보시스템 구축 1식 • 정책 수립 연구 용역 1식
3-2		아카데미파크웨이 조성	• 아카데미파크웨이 : L=2.4km • 녹색성장 3개 단위사업 • 초중등교 리모델링 8개교
3-3		대한민국 평생학습박람회 유치	• 2016년 대한민국 평생학습 박람회 개최
3-4		천문우주문화도시 기반 조성	• 마스트플랜 용역 1식 • 천문인 마을 조성 1식 • SLR 관측국 설치 1식
3-5		거창군 평생교육·고용 연계형 직업교육원 설치	• 교육원 설치 1식 • 전공과정 편성 1식 • 국가직무능력 표준 개발 1식
4-1	문화 관광	거창 창포원 조성	• 농촌테마공원 조성 1식 • 수변생태공원 조성 1식
4-2	체육 (9)	국제 원에 힐링 박람회 유치	• 2018년 4월 : 국제 원에 힐링 박람회 개최

연번	분야	공약사업명	관리지표
4-3	문화 관광 체육 (9)	빼재 산림레포츠파크 조성	<ul style="list-style-type: none"> •스피드 익스트림 타운 조성 1식 •백두대간 생태교육장 조성 1식 •거함산 향노화 체험단지 조성 1식
4-4		향 노화 힐링랜드 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 향노화 힐링단지 1식 • 연구단지 조성 1식
4-5		아홉산 선화공주 설화 콘텐츠 개발	<ul style="list-style-type: none"> • 귀촌인큐베이터 초가마을 : 30동 • 거열산성 역사문화체험장 조성 1식 • 문화콘텐츠 개발 1식
4-6		거창군 다목적 실내체육관 건립	• 체육관(지상3층) 건립 1식
4-7		국민체육센터 볼링장 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 국민체육센터 옥상 증축 : 1,115㎡ • 10레인 볼링장 설치 1식
4-8	문화 관광 체육 (9)	국제 파크골프대회 유치	• 2014. 10월 국제 파크골프대회 개최
4-9		월성·수승대권 트레킹코스 개설	• 트레킹 코스 L=40km
5-1	경제 (9)	거창승강기 글로벌화 육성	기창 Elevator한국형 모델화 <ul style="list-style-type: none"> • 전자상거래 시스템 구축 • 국내외 EXPO 참가
5-2		승강기전문 농공단지 조성	• 농공단지(320,280㎡) 조성
5-3		에너지 자립도시 추진	• 2018년 에너지 자립율 28% 달성
5-4		에너지 자립마을 육성	• 에너지 자립마을 조성 : 10개소
5-5		에코 에너지파크 조성	• 에코 에너지파크 조성 1식
5-6		거창 맞춤형 마을 만들기	• 거창 맞춤형 마을 육성 50개 마을

연번	분야	공약사업명	관리지표
5-7	경제 (9)	택시 감차계획 추진	• 2019년까지 55대 감차
5-8		전통시장 공동물류센터 건립	• 공동물류센터 건립 1식
5-9		중소기업육성기금 조성	• 2018년 까지 100억 조성
6-1	지역 개발 (12)	거창 법조타운 조기 완공	• 거창교정시설 신축1식 • 거창 지원,지정 신축1식 • 보호관찰소 신축1식 • 출입국관리소 출장소 신설
6-2		거창읍 북부 우회도로 개설	• 상림리~대평리 L=4.0km
6-3		제6교(가칭) 가설	• 교량(L=200m)1식
6-4		현 법조시설 부지 개발계획 수립	• 교육문화관련 복합시설 건립 기본계획 수립
6-5		지방도 남상~가북 구간 조기 완공	• 도로 확포장 L=23.5km
6-6		군도 4호선(병곡~산수) 확포장	• 도로 확포장 L=3.25km
6-7		舊 서흥여객 부지 개발계획 수립	• 계획 용역 1식 • 계획 수립 1식 • 사유지 매입 1필지
6-8		거창 남부 우회도로 개설	• 대평리~송정리 도로 개설 : L=2.8km
6-9		읍면 소재지 및 권역별 정비사업 확대	• 2015, 2016년 공모사업 최대응모
6-10		고향의 강 조성사업 조기 완공	• 제방 6.4km • 보개량 13개소 • 자전거 도로 1식
6-11		황강 종합 정비사업	• 제방 4.8km • 보개량 4개소 • 교량 1식
6-12		함양~울산간 고속도로 조기 착공	• 거창구간 11.7km

연번	분야	공 약 사 업 명	관리지표
7-1	도시 환경 (7)	거창읍 중앙로(로터리~대동리) 도로환경 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 보도정비 L=1000m • 전선지중화 L=50m
7-2		거창읍 교통체계 개편 및 주차난 해결	<ul style="list-style-type: none"> • 교통체계 개선 5개권역
7-3		거창읍 처리구역 하수관거 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 하수관거 설치 L=10km • 배수설비 정비 1,000개소
7-4		포켓공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 45개소
7-5		88고속도로 거창 관문 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> • 회전교차로1식 • 만남의 광장 1식
7-6		마을 하수도 설치 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 하수처리장 39개소 • 하수관거 L=138.2km • 배수설비 4,545개소
7-7		도랑 살리기 사업(30개소)	<ul style="list-style-type: none"> • 30개소 이상
8-1	일반 행정	WHO 국제 안전도시 공인 획득	<ul style="list-style-type: none"> • 국제안전도시 공인 인증
8-2	(2)	군정회의 인터넷 중계	<ul style="list-style-type: none"> • 매월 확대간부회의 홈페이지 공개

IX. 연차별 공약사업 추진 로드맵

계획수립
 착수
 완료
 계속

연번	공약사업명	2014	2015	2016	2017	2018	임기 이후
1-1	농산물 종합가공 지원센터 건립						
1-2	대도시 농축산물 직매장 개설						
1-3	친환경 한우사료 생산 시설 건립						
1-4	거창 사과·딸기산업 특구사업 추진						
1-5	친환경 약초·산채산업 육성						
1-6	딸기 유통·가공산업화 육성						
1-7	수출농업 전략적 육성						
1-8	농번기 마을단위 공동급식 지원사업						
1-9	농기계임대사업 권역별 확대 설치						
2-1	행복 나르미센터 설치 운영						
2-2	시니어클럽 일자리 확대						
2-3	온 세대 한 살림 터 조성						
2-4	노인회관 건립						
2-5	장애인 복합문화관 건립						
2-6	장애인 주간 보호시설 설치						
2-7	여성 친화도시 지정						
2-8	다문화자녀 언어교육 프로그램 도입						
2-9	다문화가족 취업박람회 개최						
2-10	산후 조리원 설치						
2-11	소아과 진료시간 연장 시행						
2-12	WHO 건강도시 인증 추진						
2-13	거창 부르미 택시 도입						

연번	공약사업명	2014	2015	2016	2017	2018	임기 이후
3-1	지식복지도시 기반 구축						
3-2	아카데미파크웨이 조성						
3-3	대한민국 평생학습박람회 유치						
3-4	천문우주문화도시 기반 조성						
3-5	거창군 평생교육·고용 연계형 직업교육원 설치						
4-1	거창 창포원 조성						
4-2	국제 원예 힐링 박람회 유치						
4-3	빠재 산림레포츠파크 조성						
4-4	향 노화 힐링랜드 조성						
4-5	아홉산 선화공주 설화 콘텐츠 개발						
4-6	거창군 다목적 실내체육관 건립						
4-7	국민체육센터 볼링장 설치						
4-8	국제 파크골프대회 유치						
4-9	월성·수승대권 트레킹코스 개설						
5-1	거창승강기 글로벌화 육성						
5-2	승강기전문 농공단지 조성						
5-3	에너지 자립도시 추진						
5-4	에너지 자립마을 육성						
5-5	에코 에너지파크 조성						
5-6	거창 맞춤형 마을 만들기						
5-7	택시 감차계획 추진						
5-8	전통시장 공동물류센터 건립						
5-9	중소기업육성기금 조성						

연번	공 약 사 업 명	2014	2015	2016	2017	2018	임기 이후
6-1	거창 법조타운 조기 완공						
6-2	거창읍 북부 우회도로 개설						
6-3	제6교(가칭) 가설						
6-4	현 법조시설 부지 개발계획 수립						
6-5	지방도 남상~가북 구간 조기 완공						
6-6	군도 4호선(병곡~산수) 확포장						
6-7	舊 서흥여객 부지 개발계획 수립						
6-8	거창 남부 우회도로 개설						
6-9	읍면 소재지 및 권역별 정비사업 확대						
6-10	고향의 강 조성사업 조기 완공						
6-11	황강 종합 정비사업						
6-12	함양~울산간 고속도로 조기 착공						
7-1	거창읍 중앙로(로터리~대동리) 도로환경 정비						
7-2	거창읍 교통체계 개편 및 주차난 해결						
7-3	거창읍 처리구역 하수관거 정비						
7-4	포켓공원 조성						
7-5	88고속도로 거창 관문 조성사업						
7-6	마을 하수도 설치 확대						
7-7	도랑 살리기 사업(30개소)						
8-1	WHO 국제 안전도시 공인 획득						
8-2	군정회의 인터넷 중계						

X. 사업 분야별 세부 추진계획

1.	기획감사실	33
2.	주민생활지원실	37
3.	창조산업과	55
4.	재 무 과	77
5.	안전총괄과	81
6.	승강기경제과	89
7.	문화관광과	99
8.	산림녹지과	103
9.	녹색환경과	113
10.	건 설 과	121
11.	도시건축과	135
12.	농업기술센터	147
13.	보 건 소	169
14.	상하수도사업소	177
15.	체육청소년사업소	181

1. 기획감사실

◇ 군정회의를 거창군 홈페이지를 통해 대민 공개함으로써 소통행정 구현

사업개요

- 위 치 : 거창군 대회의실 , 상황실
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 계속
- 사업량 : 확대간부회의(월) 12회
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
계	33	2.5	6	6	6	6
국 비						
도 비						
군 비	33	2.5	6	6	6	6
민자 등						

추진계획

- 군청 홈페이지 [군정회의] 서비스 개발(행정과) : 2014. 7.
- 제작 외주 계약(기획감사실) : 2014. 7.
- 간부회의 제작 및 서비스 : 2014. 8.

예상 문제점 및 대책

- 문제점 : 실시간 방송 서비스로 확대시 현행 방식에서는 불가
- 대책 : 디지털영상회의시스템으로 신규 구축

기대효과

- 행정의 주요 정책에 수립 과정에 대한 정보 공유로 공감대 형성 효과

2. 주민생활지원실

2-1	『행복나르미센터』 설치운영	희망복지담당
자체사업		940-3141

◆ 지역특성과 군민의 접근성·편의성을 보완, 복지 갈때기를 해소하고 원스톱 통합서비스 제공 등 체감도 높은 복지 구현을 위해 우리군에 적합한 복지전달체계 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군내
- 사업기간 : 2014년~(계속)
- 사업량 : 5개소(중앙센터1, 이동센터1, 권역센터3)
 - ※ 거창읍 행복나르미 권역센터(TF팀) 설치·운영(2개 팀)
- 사업비 [단위 : 백만원]

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	653	32	101	130	130	130	130	
국비	105	32	73					
도비								
군비	548		28	130	130	130	130	
민자등								

□ 추진계획

- 행복나르미센터 설치·운영 ('14.1.13일 업무개시)
 - ▶ 중앙센터 : 1개소(주민생활지원실/희망복지담당)
 - 지역단위 맞춤형서비스 제공체계의 컨트롤 타워 기능 수행
 - ▶ 이동센터 : 1개소(현 이동복지관 운영 강화)
 - ▶ 권역센터 : 2개소(보건지소)
 - 전문적인 복지상담, 안내, 통합사례관리, 서비스 연계 및 단순서비스 지원업무 통합 수행
- 거창읍 권역센터 추가 설치(읍 복지기능 강화)
 - 아림행복나르미 TF팀 설치운영 : 거창읍 1개 권역, 2개팀(강남/강북)
 - ☞ 읍면동 복지기능강화 시범사업과 연계 추진

- ① 조직구성 : 6명(공무원 1명, 민간전문인력 5명)
 - 팀장 : 읍사무소 복지직 중 7급 이상 경력자 배치
 - 팀원 : 통합사례관리사 2, 방문간호사 2, 자립지원상담사 1
 - 자립지원상담사는 순환 근무 예정
- ② 업무내용 : 생활밀착형 찾아가는 서비스 업무 수행
- 추가 권역센터 설치를 위한 사무 공간 등 확보
 - 사무공간 확보 : 거창읍사무소
 - 행정장비 지원(컴퓨터, 전화기 등) : 정보화담당
 - 사무기기(책상, 의자, 캐비닛, 파티션 등) : 재산관리담당
- 시범사업과 연계 운영 후 문제점 보완하여 15년부터 본격 추진
 - 거창읍 : 1개 권역센터, 2개 팀으로 운영
 - 11개면 : 2개 권역센터(서부, 동부) 지속 운영
- 시범 사업 종료 후 거창읍 별도 행복나르미센터 추가 설치 검토 (민간 전문인력 확보 포함)

□ 예상 문제점 및 대책

- 시범 사업 종료 후 지속적인 사업 추진을 위한 예산 확보
 - 민간인력 채용에 따른 인건비 및 센터 운영비 : 예산담당
 - ※ 지속적인 국비 지원 불투명
- 인력 및 업무조정 문제 관련부서 협조
 - 거창읍 행복나르미센터 별도 설치·운영 시 복지직 1명 충원 및 사무공간 확보 : 행정과, 재무과
 - ※ 기 배치된 인력 지속적인 유지
 - 행복나르미센터 방문간호사 파견 등 연계 협력 : 보건소
 - 서부, 동부 행복나르미센터 : 방문간호사 지속 파견운영
 - 아림행복나르미센터 : 공동방문상담 업무 수행 등

□ 기대효과

- 필요한 사람에게 필요한 서비스를 가까운 곳에서 원-스톱으로 지원
- 복지전달체계 개편을 통한 맞춤형서비스 제공으로 복지 체감도 향상

2-2
자체사업

시니어클럽 일자리 확대

노인복지담당
940-3123

◇ 노인일자리전담기관 운영으로 노인의 사회적 경험 및 지식을 활용할 수 있는 다양한 노인적합형 일자리를 개발하고, 참여할 수 있는 여건을 조성하여 노인의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 수행기관 : 거창시니어클럽 (거창읍 중앙로 1길 138)
- 사업기간 : 2014. 1 ~
- 사업량 : 416명
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	임가후
계	1,550	310	290	230	240	240	240	
군비	1,430	280	270	220	220	220	220	
민자등	120	30	20	10	20	20	20	

□ 추진계획

- 지역노인일자리 전담기관으로서의 역할 강화
- 노인적합형 일자리창출 고용확대 (단위 : 명)

구분	총계	'14	'15	'16	'17 이후
계	2,256	416	520	600	720
시장형	410	80	100	110	120
사회공헌형	1,846	336	420	490	600

- 공동작업장 확대(현 3개소 ⇒ 6개소)

○ 추진일정

- 노인일자리사업와 연계 가능한 지역 자원 발굴 : 2014. 7 ~
- 노인일자리사업 세부사업별 계획수립 : 2014. 12
- 시장형 노인일자리사업 시행 : 2015. 1 ~
- 노인일자리사업 수행기관 평가 실시 : 2015. 5

○ 경상남도내 시니어클럽 노인 일자리 추진 현황

기관	지정일	직원수	운영비 (백만원)	노인일자리현황(명)			비 고
				합계	시장형	사회공헌형	
창원	2006. 8	5	230	438	73	365	
진주	2007. 3	5	200	521	41	480	
양산	2008. 4	6	210	461	136	325	
진해	2002. 11	5	210	428	75	353	
김해	2006. 8	5	230	617	117	500	
거창	2013. 2	5	230	416	80	336	개발비 별도

※ 기관별 정규직원의 노인일자리 전담인력 기관별 3 ~ 5명 배치

○ 노인일자리 확대 추진

- 2014년 신청 인원 : 1,024명(선정 745, 탈락 279)
- 2015년 노인일자리 수요 조사 : 8. 중
- 수요조사 분석 후 신청자 전원 일자리 제공을 위한 예산 확보

□ 문제점 및 대책

- 농어촌지역 민간분야 노인일자리사업(시장형)의 접목의 어려움
 - 농어촌 지역은 지역특성상 진입할 시장자체가 매우 미약하여 업종 선정 및 사업운영이 도시지역보다 어려움
 - 시장형 일자리사업 저조한 생산성과 불안정한 수익구조
 - 사회공헌형 일자리사업은 지속적 사업 확대가 가능하나, **시장형 일자리사업 무한적 확대는 어려움이 상존함.**
- ⇒ 지역의 풍부한 농산물 활용 가공산업(농산물 가공, 도시락 배달사업 등)검토 및 지역의 유사기관(맞춤형 마을기업, 농촌 건강장수마을 등)과 연계 가능한 일자리 발굴 추진

□ 기대효과

- 노인 소득 증대로 빈곤 완화 및 사회참여를 통한 신체적 정신적 건강 증진
- 일자리 창출을 통한 노인문제 해소 및 지역경제 활성화에 기여

2-3
자체사업

온 세대 한 살림 터 조성

노인복지담당
940-3123

◇ 노인세대와 청소년세대가 어울려 서로 돕고 함께 생활하는 거창 스타일의 살림터 공간을 만들어 세대갈등 및 노인문제 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. 7. ~
- 사업량 : 3 ~ 5개소(시범사업)시행 후 확대실시
- 사업비 : 650백만원
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	입기이후
군비	650	0	0	50	100	250	250	

- 소.소녀가장세대 현황

계	보호가정				비보호
	가정위탁	입양가정	조손가정	공동생활가정	
142명	78명	39명	18명	7명	0

□ 추진계획

[2014.]

- 온 세대 한 살림터 입주 희망자 수요조사
 - 노인세대 : 주거시설이 있고 여유의 방이 있는 독거노인
 - 청소년 : 소년소녀가장 및 보호자가 필요 있는 취약아동
- 노인세대 희망자 주거상황 조사
 - 건물 노후화 정도, 주거공간 확보여부 등

[2015년]

- 청소년 및 노인세대 상견례 개최 : 2015. 1~2.
- 온 세대 한 살림터 입주 희망자 결연 체결 : 2015. 3.
 - 노인세대 + 소년소녀가장세대 결연
 - 입주자 계약체결 : 3~ 6개. 단위

○ 군 예산 지원

- 주거환경개선비 지원 : 개소당 1회 1,000만원내외
- 주거운영비 지원 : 개소당 . 20만원

※ 주거환경개선비 지원세대는 3년간 주거공간 제공 동의.

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 독거노인 수요는 있으나 소년소녀가장세대는 모두 보호받고 있음.
 - 가정위탁아동 : 56세대 78명(친조부모, 친.인척에 의한 양육)
 - ☞ 양육보조금 월 12만원, 부식비 월 2만원, 월세비 지원
 - 조손가정 : 18명(가정위탁보호 범위에 제외된 조손가정)
 - ☞ 양육보조금 월 5만원, 명절위로금 2회 10만원 지원
 - 공동생활가정: 1개소(5인~7인이내의 아동을 보호하는 시설)
 - ☞ 종사자 수당, 운영비등 57백만원 지원(경천공간)

○ 대 책

- 온 세대 한 살림터 구성원 변경(룸세어링+멘토링 사업)
 - ☞ 독거노인, 학생(대학생,고등학생), 소년소녀가장으로 구성
- 온 세대 한 살림터 역할 분담 협약 체결
 - 독거노인은 주거를 제공(3년간 주거 제공)
 - 학생은 어르신들의 생활편의 도모 및 청소년 학습지도,
 - 소년소녀가장은 어르신 말벗 및 심부름 도와주기
- 군 예산지원 : 주거환경개선비 1회 1,000만원, 운영비 월 20만원
 - 독거노인 : 집 임대료 월10만원지원
 - 학 생 : 청소년 학습지원비 지원 월10만원(주2회 지도)
- 한 살림터 구성원 단기계약은 수요자 욕구에 맞추어 3개월씩 계약하되 구성원 동의하에 연장 가능

※ 소년소녀가장세대는 20세미만, 학생은 졸업시까지

□ 기대효과

- 독거노인과 소년소녀가장세대에 거창에 자취하는 학생(대학생, 고등학생)을 멘토로 참여시켜 각 세대에 맞는 역할분담으로 노인 및 청소년 문제를 해결하고 세대갈등을 해소함.

노인회관 건립

◇ (사)대한노인회 거창군지회 건물의 노후화 및 협소하여 사용이 불편하고 접근성이 떨어져 송정택지개발지구 내 사회복지타운 조성으로 맞춤형 노인여가복지를 제공함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2016.
- 사업량 : 대지 1,650㎡, 건축 1,000㎡, 지상 3층
 - 공동작업장, 사무실, 취업상담실, 다목적 강당, 식당, 체력단련실
- 사업비 : 2,000백만원
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16
계	2,000	0	1,000	750	250
도비	1,000	0	1,000	0	0
군비	1,000	0	0	750	250

□ 추진계획

- 사회복지타운 조성과의 연계(보훈회관, 장애인복합문화관, 노인회관)
- 2014. 12. : 사업부지 매입
- 2015. 1. ~ 3. : 실시설계
- 2015. 4. ~ 5. : 설계검토 및 건축공사 발주
- 2015. 5. ~ 2016. 5. : 공사추진 및 준공
- 2016. 6. : 기자재 설치 및 입주

□ 문제점 및 대책

- 사업비 2,000백만원 중 1,000백만원은 2014년에 도비로 확보
 ☞ 2015년 예산 편성 시 건축비 750백만원 확보 요청

□ 기대효과

- 노인회관 건립으로 노인여가공간을 확보하여 노인 권익신장 및 노인회 활동 활성화로 노인여가복지 증대

2-5
자체사업

장애인 복합문화관 건립

복지정책담당
940-3092

- ◇ 장애인 체육, 문화, 복지시설 및 장애인단체 통합 사무실 운영
- ◇ 장애인의 재활 및 사회 참여확대를 위한 문화, 체육, 동아리 활동에 이르기까지 one-stop 서비스 제공으로 거동이 불편한 장애인의 효율적인 시설이용 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 송정택지지구 내
- 사업기간 : 2014. ~ 2016.(3년간)
- 사업내용 : 부지 1,000㎡, 건축 990㎡, 지상 2층
- 주요시설
 - 체육·재활시설 : 체육관 겸 강당, 헬스·재활실, 탁구장, 샤워장
 - 문화시설 : 문화·예술·여가 복합 동아리방, 세미나실 겸 도서관
 - 서비스시설 : 주간보호시설, 장애인 4단체 사무실 등
- 사 업 비 : 2,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16
계	2,500	-	500	1,500	500
국 비	500	-	-	500	-
도 비	500	-	-	500	-
군 비	1,300	-	500	500	300
민자 등	200	-	-	-	200

□ 추진계획

- '14. 4.~6. : 국·도비신청 및 도·중앙부처 방문 협조 요청
- '14. 7. : 지방투융자 심의(도)
- '14. 12. : 건립부지 매입
- '15. 1.~'16. 5. : 사업설계, 공사추진 및 준공, 입주

□ 예상 문제점 및 대책

- 장애인 이용시설은 지방이양사업으로 국비 확보 애로
⇒ 교부금 및 복권기금사업 신청을 통한 국·도비 확보 총력

□ 기대효과

- 거창군 장애인 5,000여명의 재활 및 사회 참여확대를 위한 문화, 체육, 서비스, 여가활동 등 다양한 프로그램을 one-stop 제공함으로써 거동이 불편한 장애인의 활용도를 높여 삶의 질 향상

2-6
자체사업

장애인 주간 보호시설 설치

복지정책담당
940-3093

- ◇ 일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간동안 보호 및 재활 프로그램 참여기회 제공
- ◇ 낮 시간 동안 장애인 가족이 안심하고 사회 경제활동 영위

사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 송정택지지구 내
- 사업기간 : 2015. ~ 2016.(2년간)
- 사업내용 : 장애인 주간보호시설 설치 및 운영
- 주요시설 : 건강재활 프로그램실, 휴게실, 주방 등
- 사 업 비 : 200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16
계	200			200	
국 비					
도 비					
군 비	200			200	
민자 등					

추진계획

- 장애인복합문화관 내 주간보호시설 설치

예상 문제점 및 대책

- 시군이양사업으로 건립비 및 운영비 국·도비 확보 애로
 - ※ 건립 후 매년 100백만원의 운영비 소요 예상
 - ⇒ 장애인복합문화관 내 설치하여 설치 및 운영비 최소화

기대효과

- 중증장애인에 대한 보호 및 재활을 가족구성원만의 책임이 아닌 지역사회 차원에서 해결방안 제시

2-7
자체사업

여성친화도시 지정

여성아동담당
940-3153

- ◇ 일상생활의 안전, 편의, 건강, 성장을 보장하는 지역정책에 대한 요구에 부응
- ◇ 사회적 약자를 배려한 도시로서 여성이 살기좋은 도시, 군민 모두가 살기좋은 도시 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014~2019

○ 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	2,064	34	30	500	500	500	500
군비	2,064	34	30	500	500	500	500

○ 추진방향

- 기존 여성정책의 개선
- 타부서 사업의 여성친화적 개선
- 물리적 환경의 여성친화적 개선
- 성평등 정책 추진 기반 정비
- ※ 여성친화도시는 “차이를 인정하고 차별을 극복하면서, 서로 다른 사람과 서로 다른 생각들이 아름답게 공존하는 것”

□ 추진계획

○ 2014년(지정준비)

- 여성친화도시 조성 중장기 계획 수립 용역
 - 계약업체 : 재)경남발전연구원
 - 추진내용 : 지역적·사회적 여성친화도시 여건분석, 지역여성 정책 요구도 분석 등
- 민관 준비기구(협의체) 구성 : 용역에 대한 목표와 방향에 대해 함께 공유
 - 거창군 성평등 기본 조례 제8조(성평등정책위원회 설치)에 준하여 구성

- 각종위원회 위촉직 위원 중 여성위원 40%이상 구성
- 여성친화도시 지정신청서 제출 : 2014. 09. 26까지
- 조례 제(개)정

○ 2015년 ~ 2018년(사업추진 및 평가)

- 여성친화도시 교육
 - 타부서의 적극적인 참여가 필요하므로 공무원 행정역량강화
 - 민-관 협의기구 교육 및 워크숍
- 부서별 연간 사업계획 및 단계별 사업계획
- 사업추진 점검 및 관리체계구축
- 부서별 사업 컨설팅 제공
- 사업평가 및 관리체계 마련
 - 실적별 사업 평가회
 - 과제관리카드의 정기적 점검
- 사업평가회

예상 문제점 및 대책

○ 여성친화도시 조성 전담인력 미배치

- 기존여성정책 부서의 노력만으로 어려우며, 모든 부서의 참여와 협력을 이끌어내는 것이 중요
- 기관단체장의 의지로 표명됨

기대효과

- 지역의 여성정책을 활성화시키고 여성의 관점을 바탕으로 도시 공간정책을 종합적으로 추진
- 여성정책 활성화 및 여성의 관심과 요구를 바탕으로 한 도시 정책을 추진하여 여성뿐만 아니라 지역주민 전반의 삶의 질을 향상

2-8
자체사업

다문화자녀 언어교육 프로그램 도입

여성아동담당
940-3152

- ◇ 언어습득이 어려운 다문화가족 자녀에게 집중적인 언어습득 및 학습 지원을 하여 다문화가족 자녀 양육 어려움을 해소하고,
- ◇ 다문화가족의 자녀에 대한 체계적이고 전문적인 언어발달을 통해 건강한 사회 구성원 및 글로벌 인재로 성장할 수 있는 초석 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사업량 : 언어발달사 5명, 수혜대상 매년 20명정도
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18
군비	290		60	70	80	80

□ 추진계획

- 2014년
 - 실태조사 실시 : 다문화가족 자녀 중 언어의 장애가 있는 아동
 - 언어촉진대상 및 심화 평가 및 촉진대상자를 선정
 - 언어발달 교육이 필요로 하는 대상자 현황 파악
 - 관내 언어발달 치료사 현황 파악
- 2015년이후
 - 사업대상 : 만2세 ~ 만5세(필요시 만7세)
 - 언어발달사 모집 : 2015. 1월중(5명 정도)
 - 수혜대상자 신청서 접수 : 2월중
 - 교육방법 : 개별 방문 학습지도
 - 교육내용 : 언어발달 진단 및 교육 실시
 - 언어발달 체크 및 상담, 발음(조음·음운) 체크 등 언어발달 진단
 - 어휘·구문 발달 촉진, 대화, 의사소통 및 사회성 증진 등 언어교육

- 교육절차 : 언어발달 진단· 평가신청접수 → 발달단계 진단
→ 언어발달교육 실시
- 교육프로그램 : 주2회(1회당 40분) 모둠, 개별교육
- 교육은 진단결과 지원이 필요한 아동에게 한해 진행되며 지속적으로 지원하여 학교생활에 조기 적응

□ 예상 문제점 및 대책

- 언어치료사 채용은 현실적으로 군지역은 거의 어려운 실정임 (2012년에 2번의 채용공고에도 신청자가 없어, 변경채용공고를 3차에서 유아교육 4년제 자격자를 채용)
- 전문적인 언어 치료가 필요한 경우 장애인복지관 또는 거창교육청의 언어치료사의 협조로 교육 서비스 지원
- 언어치료사 채용이 불가능 할 경우 유아교육자격자를 채용하여 다문화가정 자녀 언어발달지원 양성교육을 실시 각 가정을 방문하여 1:1로 지원함

□ 기대효과

- 다문화가족 자녀의 한국어 활용능력 및 이해력 증진
- 다문화가족 자녀에 대한 차별 및 소외감 해소, 건전한 또래 문화 조성을 통한 사회통합 실현

- ◇ 다문화가정이 지역사회와 화합 · 소통하고 여성이 진로설계를 통해 지역경제에 참여 할 수 있도록 하고
- ◇ 다양한 취업정보 제공 및 부대행사를 통해 취업지원서비스를 제공하기 위한 박람회 개최

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 위 치 : 종합사회복지관 대회의실
- 참여대상
 - 관내 중소기업 및 서비스업종 등 구인을 희망하는 기관 등
 - 다문화가족 구직을 희망하는 자

○ 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
군 비	120	-	30	30	30	30

□ 추진계획

- 2014년
 - 일자리에 참여할 수 있는 대상자 실태조사 실시 : 노인회, 장애인지회, 다문화가족지원센터, 읍·면사무소 등
 - 어떤 업종에 구직을 희망하고 1일 몇시간 일을 할 수 있는지 파악
 - 관내 중소기업 및 서비스업종 등 파악 및 구인을 희망하는 업체 실태조사(경제과와 협의 연계추진)
- 2015년 이후
 - 행 사 명 : 거창군 다문화가족 채용박람회
 - 참여대상 : 관내 다문화가족 (309세대 1,000여명정도)
 - 참여업체 : 관내 중소기업 및 서비스업종 등

- 행사내용
 - 현장면접, 간접기업이력서 접수대행, 구인·구직상담
 - 직업적성검사, 이력서작성방법지도, 이력서사진촬영
 - 부대행사 (각종 교육훈련과정 안내, 창업상담 및 지원 안내 등)
- 행사홍보방법 : 방송 및 신문, 옥내 및 옥외광고, 인터넷 등

□ 예상 문제점 및 대책

- 다문화가정이 한정되어 있고, 관내 업체들 중 구인을 희망하여 참여하고자 하는 업체 현황이 미지수임.
- 기초수급자, 노인, 장애인, 다문화가정 등 근로의지나 능력은 있으나 방법이나 기회를 찾지 못하고 있는 계층 전반을 대상으로 개최하는 것이 타당할 것으로 판단됨.
- 또한, 박람회(일자리 창출 및 지원서비스를 확대)와 더불어 아이돌봄, 이민여성에 대한 재교육, 지속적인 부부상담 등을 통하여 지지하는 서비스를 병행하여 지원함이 타당함.

□ 기대효과

- 개인의 특성과 근로의지, 성격테스트 등을 통한 취업상담 및 취업지도를 통한 근로의 기회 제공.
- 저소득계층 및 다문화가정의 취업 및 창업의 기회 제공
- 다문화가정에 대한 상담, 교육 등으로 지속적인 일자리 참여로 삶의 질 향상.

3. 창조산업과

지식복지도시 기반구축

- ◇ 우리군에서 추진하고 있는 교육관련 모든 프로그램을 컨트롤 하고 교육의 경쟁력 제고와 시너지 효과를 극대화 하여 교육도시 위상 제고
- ◇ 일반 군민이 일상 속에서 교육에 대한 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있는 기회를 제공하여 교육 및 지식복지 기반 구축
- ◇ 교육도시 거창, 평생학습도시 거창을 알리고 교육의 패러다임을 전환시키고자 하는 노력의 일환

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 관내
- 사업기간 : 2014~2015.(완료 후 계속)
- 사업내용
 - 교육현황, 역사, 교육지원, 평생교육, 외국어교육특구, 인문학 도시, 장학지원, 교육 및 기관, 평생학습계좌제 등 종합정보 시스템 구축
 - 지식복지와 재능기부를 연계한 지식기부 시스템 구축
 - 지식복지 및 인문학도시 인프라구축 정책수립 연구용역
- 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17 이후
계	219	69	50	50	50
군 비	219	69	50	50	50

□ 추진계획

- 2014년
 - 각종 교육프로그램, 교육계획, 교육시설 현황 자료 수집 및 편집 : 2014. 1~6.
 - 관련기관 및 간담회, 참여기관 심사 및 선정 : 2014. 7.
 - 종합정보시스템 구축 용역 발주 : 2014. 7.

- 종합정보시스템 구축 시범운영 및 보완 : 2014. 8. ~ 12.
- 종합정보시스템 본격 운영 : 2015. ~

○ 2015년 이후

- 지식복지 및 인문학도시 인프라구축 정책수립 연구용역 시행후 결과 반영

□ 예상 문제점 및 대책

- 방대한 교육관련 자료수집, 교육프로그램, 참여기관 등 파악 및 취합 애로
⇒ 부서 및 관계기관·단체 홍보 확대로 관심 제고 노력

□ 기대효과

- 언제, 어디서나, 누구나 교육기회를 접할 수 있는 지식복지 환경조성
- 교육 프로그램 운영 일원화로 효율성 제고 및 교육도시 홍보효과 증대
- 학습자의 체계적인 학습설계, 학습이력통합관리, 평생교육 참여활성화
- 지역 인적자원 관리 및 개발, 지역 내 교육기관 네트워크 및 파트너십 확대

- ◇ 인생 100세 시대 평생학습체제 구축 및 학습하는 문화 확산
- ◇ 군 단위 최초 박람회 유치를 통한 평생학습도시 위상 제고

□ 사업개요

- 사업명 : 대한민국평생학습박람회
- 일시 : 2016. 10월경 / 4일간
- 참여대상 : 130개 평생학습도시, 16개 시·도 지역정보센터 등
- 주요내용 : 홍보체험관 운영, 국제학술대회, 토론회 등
- 참여인원 : 310,000명(제3회 전국평생학습박람회 추정 : 제천)
- 주최 : 교육부, (사)한국평생교육총연합회
- 주관 : 거창군
- 후원 : 경상남도, 경상남도교육청, 평생교육진흥원
- 사업비 : 15억원(국비 2, 도교육청 3, 도비 5, 군비 5)

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16
계	1,500				1,500
국비	200				200
도비	500				500
군비	500				500
민자등	300				300

□ 추진계획

- 기본계획 수립(2014. 9. ~ 2015. 8.)
 - 평생학습박람회 개최지 벤치마킹 : 2014. 9
 - 평생학습박람회 자문위원단 구성 및 회의 : ~ 2015. 5월한
(평생학습도시, 평생교육실천연합회, 민간단체 등)
 - 기본계획(예산확보) 및 공모신청서 작성 : ~ 2015, 7월한
 - 평생학습박람회 추진팀 구성

○ 공모신청

- 공 모 : 매년 8월경 희망 학습도시 공모(평생교육진흥원)
- 심 사 자 : 대한민국평생학습박람회 선정위원회
- 심사내용 : 사업계획, 개최장소·시설, 단체장 의지, 예산확보 등
- 심사방법 : 서류심사 ⇒ 현장실사 ⇒ 선정
- 결과발표 : 제4회 대한민국평생학습박람회 폐막식 시(2015. 10)

○ 개최준비

- 1단계 : 기본계획(장소, 예산 등) 확정, 운영조직위원회 구성
- 2단계 : 관련기관 회의 개최, 테마별 운영프로그램(안) 선정, 홍보 계획 수립
- 3단계 : 전국평생학습박람회 실무자 설명회, 전국 우수 프로그램 공모
- 4단계 : 프로그램 확정, 자원봉사자 모집, 지역관계자 설명회 등
- 5단계 : 운영지침 통보, 매뉴얼 확정, 상황실 설치, 박람회 진행

□ 문제점 및 대책

- 대한민국 평생학습박람회 유치 재원 확보 : 15억원
 - 군비 5억원, 도비 5억원 2016년도 본예산에 편성 확보
 - 국비(2억)·도교육청비(3억) 5억원 사전 확보
- 숙박시설 500실 확보(우리군 1,203실) : 1일 숙박인원 1,000여명
- 학술대회 및 세미나 시설 확보 및 주차시설 등 확보
- 제5회 대한민국 평생학습박람회 운영위원회 전담팀 구축 필요

□ 기대효과

- 평생학습도시 위상 제고 및 교육도시 거창 브랜드 강화
- 다수의 전국 평생학습관계자 참가 및 관람으로 인한 경제 활성화

3-4
자체+국가 공법인사업

천문우주문화도시 기반 조성

창조산업담당
940-3733

- ◇ 국내 최초 'SLR 관측국' 추진을 계기로 .성우주창의과학관, 천체관측대회 등 우리군이 보유하고 있는 자원을 활용하여
- ◇ 천문우주관련 기반 구축을 통한 천문우주문화도시로의 토대 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 전역 / 신원면 과정리 산 162번지
- 사업기간 : 2014 ~ 2016. 3월 / SLR 관측국 개관에 맞춰 진행
- 사업량 : SLR 관측국 외 천문우주문화도시 기반 조성
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16
계	26,109	3,050			
국비	1,000	1,000			
군비	2,109	2,050	19	20	20
민자 등	23,000		천문연구원 직접 집행(SLR)		

□ 추진계획

- 2014년
 - 천문우주문화도시 마스터플랜 수립 용역 : 한국천문연구원 자문
 - 천문우주 관련 스토리개발, 기초 자료 조사
 - 천문인마을 조성을 위한 사전 협의
 - ↳ 주민 자발적 조합 설립, 조성을 유도하고, 마을 필수 기반시설 등의 지원은 관련 부서와 협의 추진
- 2015년 이후
 - 경남 미래 50년 전략사업 '전원형 지식기반산업 콤플렉스파크' 연계
 - ↳ 천문우주관련 첨단산업 기업, 연구기관 등 유치
 - ↳ 천문인 마을조성, SLR관측국 연계한 관련 인구 유입 유도
 - 천문우주문화도시 거창군 전국 홍보 실시

○ 2016년 이후

- SLR 관측국 개관과 동시에 ‘천문우주문화도시’ 선포식 진행

□ 예상 문제점 및 대책

○ 천문인마을 조성

- 현재는 조합을 구성하여 자체 추진하고, 필수 기반시설에 대해서만 관련부서와 구두 협의한 사항으로

- 향후 사업 진행시 과도한 지원 요구시 사업 추진 차질 우려

○ 전원형 지식기반산업 콤플렉스 파크 연계

- 향후 50년 전략사업으로 단기 성과를 거둘 수는 없으나, 천문우주관련 기업 및 기관 유치 할 수 있도록 지속 연계 추진

□ 기대효과

○ 국내 최초, 유일의 고정형 SLR 관측국과 연계한 거창군만의 특색을 가진 천문우주문화도시 기반 구축

○ 특색있는 볼거리와 풍부한 천문우주관련 자원으로 사계절 관광객 유치, 인구유입, 관련 기업 및 연구기관 유치 등 거창군 위상 제고



3-5	거창군 평생교육 · 고용 연계형 직업교육원 설치	평생교육담당
자체+민자사업		940-3683

- ◇ 대학진학 중심의 일반계 학교 위주 교육으로 과도한 입시 경쟁 만연
- ◇ 전공과 직업세계 환경과의 불일치 현상 심화
- ◇ 산업체 인력 수요에 부응하는 공급체계 부재로 구직난 속 구인난 병존

□ 사업개요


- 위 치 : 거창군 관내(적정부지확보 또는 기존시설활용)
- 사업기간 : 2014. ~ 2020.
- 사업량 : 부지, 건물, 휴식 공간, 인건비, 비품, 실험 실습 장비 등
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	15,000	1,500	5,500	3,000	2,500	2,500	
군 비	800		200	200	200	200	
민자 등	14,200	1,500	5,300	2,800	2,300	2,300	

□ 추진계획

- 제 1단계 : 도입 단계 (2014. ~ 2016.)
 - 교육원 추진체제 구축 : 추진단 구성, 운영 주체 선정
 - 교육원 설치 인가
 - 전공과정 편성
 - 교육원 신축 : 부지확보, 건축, 장비 확보 및 설치 등
 - 전문인력 확보, 추진상황 평가 및 환류, 학생모집, 개원

<학교 - 기술훈련원 - 산업체의 완성형 직업교육체제>

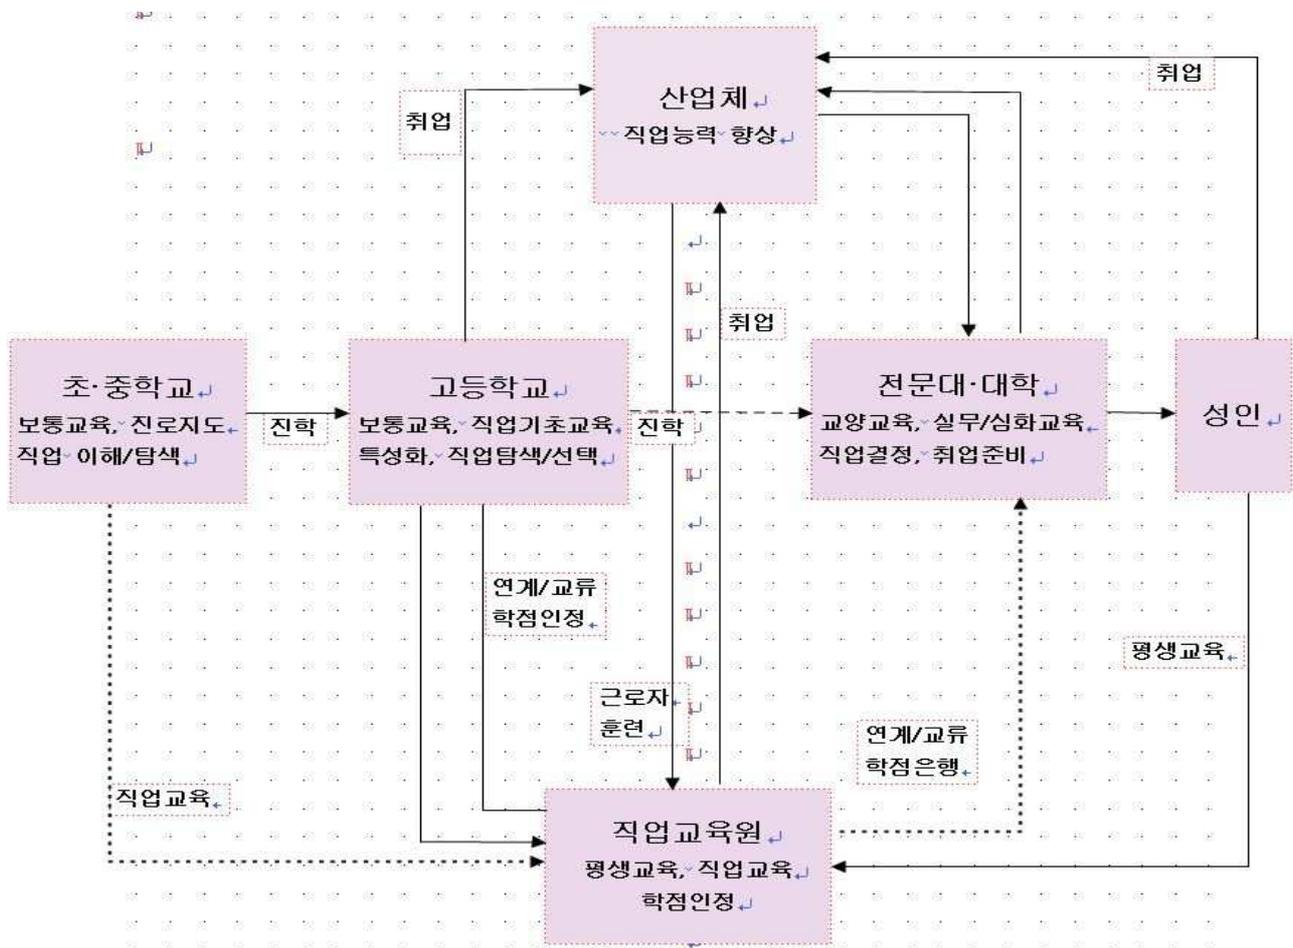

○ 제 2단계 : 확장기 (2017. ~ 2018.)

- 교육과정 확대 개편 : 직능지향 완성형 직업교육 분야
- 학점은행제 추진
- 국가직무능력표준(NCS) 개발

○ 제 3단계 : 정착기 (2019 ~ 2020.)

- 직능지향의 열린 직업교육 정착
- 일·학습·삶이 하나 되는 평생교육 이념 구현
- 지방자치단체 직업교육 모형 제시

□ 예상 문제점 및 대책

- 지방자치단체가 직업교육기관을 자체적으로 설립하여 운영할 수 있는 법적 근거가 미약하고 부지확보, 운영주체 선정 애로
⇒ 민간주도 설립을 유도하고 주민의견 적극수렴

- 향후 학령인구 감소에 따른 고등교육 입학자원이 부족한 추세
⇒ 관내에 있는 도립거창대학교와 승강기대학교는 차별화된 직업
교육 전략과 교육대상자를 확대하여 모집 필요
- 설립시 제시된 전공학과에 대한 충분한 분석과 산업현장 기업체
연계협력 방안에 대한 면밀한 검토후 추진
- 지역 특성과 산업구조와 부합하는 직업운영시스템 구축

□ 기대효과

- 평생교육을 통한 주민 각자의 자아실현 기회 제공
- 직업교육 진흥을 통한 사교육비 경감과 청.실업 해소
- 산업체 인력 수요에 부응하는 양질의 인력 공급
- 지방자치단체 직능지향 완성형 직업교육 모형 제시

4-2	국제원예힐링박람회 유치	창조전략담당
자체사업		940-3692

- ◇ 2017년경 대부분 완료되는 창조도시 조성사업들과 연계하여 국제 공인 박람회 개최
- ◇ 청정생태도시의 지역 브랜드 제고함으로써 미래 경쟁력 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 거창군 남상면 대산리/남하면 무릉리 일원
- 사업기간 : 2018. 4. 28일~10. 28일(6개월간)
- 사업량 :
 - 국제원예힐링박람회 조성사업 (12,800백만원/104,000m²)
 - 국제원예힐링박람회 운영비 35% (31,878백만원)

○ 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'15	'16	'17	'18
계	44,678	6,478	8,935	14,631	14,634
국비	13,403	1,340	2,680	4,691	4,692
도비	11,170	1,117	2,234	3,909	3,910
군비	20,105	4,021	4,021	6,031	6,032
민자 등					

□ 추진계획

- 2014년
 - 기본구상안 완성 : '14. 7월 초
 - 의견수렴을 위한 전문가 포럼 : '14. 7월 초
 - 박람회 개최 경상남도 협의 : '14. 7.
 - 주관부처 선정 및 기획재정부 국제행사 승인신청 : '14. 7. ~ 8.
 - 국제행사 승인을 위한 타당성 용역 : '14. 7. ~ 8.
 - AIPH 현장실사 : '14. 8.

- AIPH 중국청도 총회 승인 예정 : '14. 9.
- 박람회 조직위원회 설치 및 지원조례 제정 : '14. 9.
- 박람회 조직위원회 조직 및 재단법인 설립 등 행사기획 후속절차 진행 : '14. 9. ~ 10.
- 국토교통부 사업인정 고시 : '14. 12.
- 2015년 이후
 - 조직위원회 창립총회 : '15. 3.
 - 박람회장 기본설계 : '15. 5. ~ 6.
 - AIPH 국제포럼 개최 : '16, '17년 1회씩
 - 박람회장 조성공사 완료 : '17년까지

□ 예상 문제점 및 대책

- 기획재정부의 국제행사 축소 방침에 따른 국제행사 승인 및 주관부처 선정 및 국·도비 등 예산확보 애로
 - 경남도 및 주관부처와의 유기적이고 적극적인 협조를 바탕으로 기획재정부 국제행사승인을 노력

□ 기대효과

- 지속가능한 농업경쟁력 확보 및 세계적인 국제행사로 관광 수익 및 일자리 창출로 지역경제 활성화
- 조경, 원예, 화훼, 힐링 등 미래성장 동력산업 선점

- ◇ 원전 안전성 문제의 지속적 제기과 동·하절기 전력대란 위기
- ◇ 지구 온난화로 인한 기후변화가 우리군 농업분야에도 영향을 미침
- ◇ 우리군은 도시 전체를 대상으로 에너지 자립도시를 만드는데 최적의 여건임

□ 목 표

- 2018년까지 에너지 자립율 28%달성
 - 에너지 자립률 '14년 6월말 4.28% ⇒ '18년 28% 달성
 - 에너지 총사용량 148,422toe
('14년 6월말 6,355toe ⇒ '18년 42,166toe)

□ 총 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17	'18
계	135,415	2,629	37,124	47,760	17,960	14,792	14,970
국 비	10,433	1,046	1,135	1,878	2,132	2,121	2,121
도 비	927	86	127	162	162	195	195
군 비	9,869	344	1,022	2,486	1,932	2,043	2,042
민자등	114,186	1,153	34,840	43,234	13,734	10,613	10,612

□ 추진과제

- 소수력을 활용한 에너지 자립마을 조성 : 10개 마을 9.3억
- 송정도시개발지구 신재생 융복합 타운 조성 : 100호 85.2억
- 감악산 풍력단지 조성 : 7기 17.5MW 500억
- 시민햇빛발전소 건립 : 500kw 16억
- RPS 사업 민간햇빛발전소 건립 : 10.9MW 333억
- 공동주택 베란다 활용 햇빛발전소 건립 : 1,000호 10억
- 노인여가시설 태양광 보급 : 200개소 19.2억
- 패시브하우스 민간보급사업 : 55호 18억
- 전력효율화 향상사업 LED 조명등 보급 : 15,000등 26.9억
- LED 조명등 민간보급 : 9,720등 9억
- 그린팩토리 사업 : 8MW 256억
- 신재생에너지 주택지원사업 : 700호 7억

에너지 자립마을 육성

- ◇ 신재생에너지 및 고효율 조명 보급을 통한 에너지 자립형 마을 조성
- ◇ 교육 및 모니터링을 통한 주민 참여형 에너지 관리시스템 구축

목 표 : 2018년까지 에너지 자립마을 10개 육성

총 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
계	15,143	848	1,360	2,720	6,135	4,080
국 비	6,474	399	675	1,350	2,025	2,025
도 비						
군 비	7,049	449	550	1,100	3,300	1,650
민자 등	1620		135	270	810	405

추진계획

- 최적의 에너지 시스템(햇빛지도) 구축 : 266마을, 50백만원
- 에너지 자립마을 육성

주요내용	계	2014	2015	2016	2017	2018
마을 수	10	1	1	2	3	3

- 마을기업형 에코 협동조합 육성 : 1MW <100kw급 10개소>
 - 대 상 지 : 집하장 또는 선별장 지붕, 마을공동 유희부지 등 활용
 - ⇒ 마을공동체 직영 또는 임대사업으로 추진

기대효과

- 에너지 자립마을 조성을 통한 주민 복지증진

거창 법조타운 조기 완공

- ◇ 법조 관련기관(법원·검찰·교정시설·보호관찰소 등)을 묶어 타운화
- ◇ 법조행정 민원인 편의 도모, 거창읍 낙후지역개발 및 지역현안 문제를 동시에 해결코자 하는 주민 숙원 사업

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 성산길 213-5 일원
(가지리 1345-24 일원)
- 사업기간 : 2013 ~ 2017 (총 5년)
- 사업량
 - 거창 교정시설 신축 (160,818m²)
 - 거창지원·지청 이전신축 (33,000m²)
 - 보호관찰소 신축 (3,300m²)
 - 출입국관리사무소 출장소 신설 (3,300m²)
 - 도로개설 등

○ 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17
계	192,200	12,766	17,046	29,883	82,271	50,234
국비	171,000	9,300	9,446	23,783	80,254	48,217
도비						
군비	21,200	3,466	7,600	6,100	2,017	2,017
민자 등						

□ 추진계획

- 2014년
 - 전 군민 공감대 형성을 위한 홍보 및 참여 기회 마련 : 연중
 - 주민설명회, 타 지역 주민견학 등 : 연중
 - 교정시설 부지조성 및 보상 추진 : '14. 4 ~ 12
 - 법원·검찰청 부지조성 및 보상 추진 : '14. 4 ~ 12

○ 2015년 이후

- 교정시설 신축 : '15. 1 ~ '17. 12

- 법원·검찰청·보호관찰소·출입국관리사무소 거창출장소 이전 신축
: '15. 6 ~ '17. 12

예상 문제점 및 대책

○ 지방선거시 표출된 군민갈등 해소 및 법조타운 조성의 필요성과
공감할 수 있는 여건 마련 중요

→ 주민설명회·교육·토론회 등 개최로 군민 공감대 형성

기대효과

○ 상주인구 증가 및 지방세수·지방교부세 확대

○ 법조관련 기관 이전·신축에 따라 지역경제 활성화

○ 신시가지 개발을 통한 낙후지역 균형발전

○ 주택수요 창출 및 지역일자리 창출

6-4	현 법조시설 부지 개발계획 수립	창조전략담당
자체사업		940-3693

- ◇ 기존 거창지원·지청 부지 및 건물을 활용하여, 주민들의 문화욕구 충족과 창조적 문화인재 양성을 위한 공간마련
- ◇ 거창을 대표할 수 있는 랜드마크로 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 상림리·중양리 現 거창지원·지청 부지
- 사업기간 : 2014 ~ 2017 (총 4년)
- 사업량 : 교육문화 관련 복합시설 1식
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
계	50,000		13,750	15,000	18,000	13,750
국 비	25,000		7,500	7,500	8,500	7,500
도 비	12,500		3,750	3,750	4,750	3,750
군 비	12,500		2,500	3,750	4,750	2,500
민자 등						

□ 추진계획

- 2015년 이후
 - 예산 신청 및 예산 확보 추진 : '15년
 - 주민공모 및 공청회 개최 등 의견 수렴 : '15년
 - 기본계획수립 및 타당성관련 용역 시행 : '15년 하반기
 - 거창지원·지청 이전지와 현부지 교환 : '15년 하반기
 - 기본설계 및 실시설계 : '15년 하반기
 - 現 거창지원·지청이 신부지로 이전 : '16년 말(예정)
 - 조성공사 착공 : '17년 상반기

□ 예상 문제점 및 대책

- 부지활용에 대하여 주민 및 각종 시민단체 등 다양한 의견개진에 따른 군민갈등 발생예상
→ 주민공모, 토론회 등을 통한 다양한 의견수렴 후 사업추진
- 국비 등 사업비 확보 애로
→ 기획재정부, 문화체육부, 경남도 등 관련 부처와의 지속적인 협의를 통한 사업비 확보

□ 기대효과

- 군민 누구에게나 문화지식 제공 및 문화활동을 보장함으로써 문화·지식복지 실현
- 기존의 건물을 재활용함으로써 효율적인 공간활용과 친환경 이미지 구현
- 문화·감성·지식 도시로서의 이미지 브랜드 제고

○ 2015. 이후

- 신규 일반농산어촌개발 공모사업 대상지 최대 선정을 위한 세부 계획 수립 추진

예상 문제점 및 대책

- 농림축산식품부 농촌 지역개발정책 개편방안에 따라 H/W 중심의 사업 추진에 따른 사후 운영 애로 등 다양한 문제점 발생에 따라 신규사업의 지구수와 예산을 대폭 감축할 예정으로사업 확대 추진 애로

기대효과

- 지역의 균형있는 발전 및 지역경제 활성화로 외부 체험관광객 증대
- 정주환경 개선을 통해 주민들의 삶의 질 향상으로 귀농귀촌 유도

4. 재무과

6-7	舊 서흥여객 부지 개발계획 수립	재산관리담당
자체사업		940-3262


- ◇ 기존 서흥여객 부지 교환취득 후 공유재산 활용도를 제고
- ◇ 강남권 요충지를 도심균형발전을 위한 거점과 거창의 진출·입로변 랜드마크로 자리매김 할 수 있도록 개발계획 수립

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 김천리 350외 1필지
- 사업기간 : 2014 ~ 2016
- 사업량 : 2,820㎡(일반상업지역)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17
계	830			30	800	
국비						
도비						
군비	830			30	800	
민자등						

○ 사업대상지

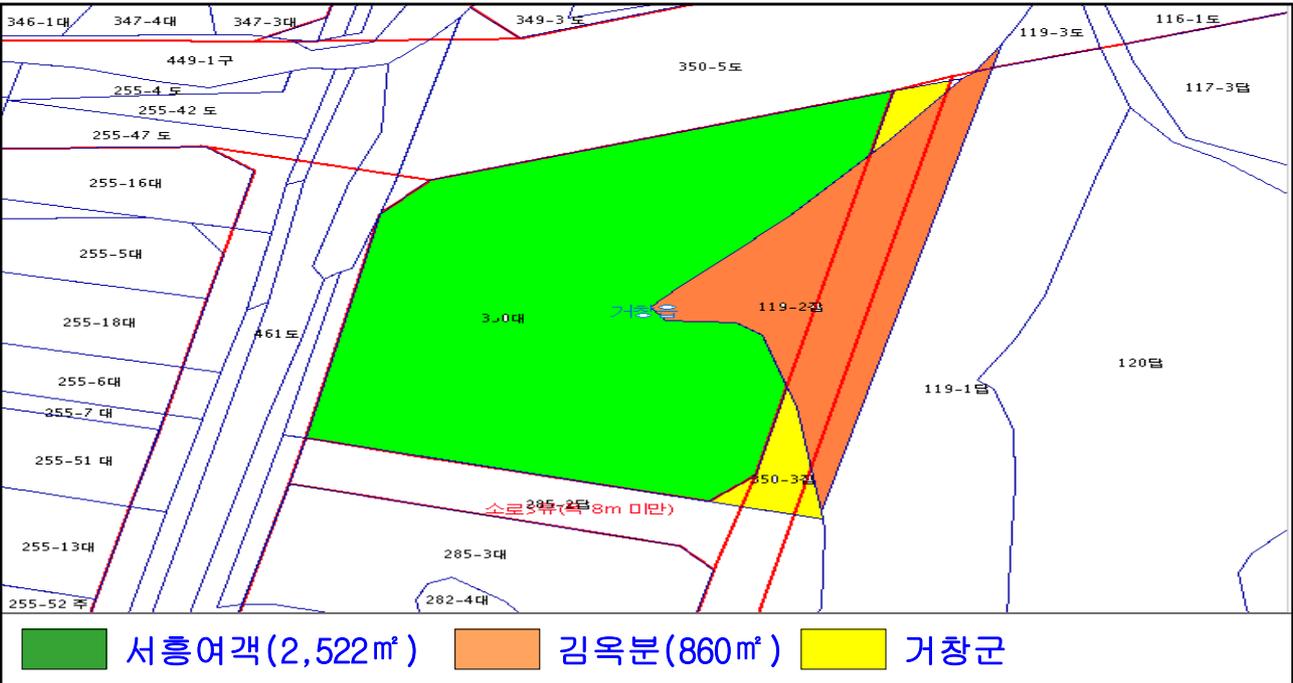

□ 추진계획

○ 2014.

- 사례수집 및 벤치마킹 : '14. 8. ~ 10.
 - KAMCO(한국자산관리공사) 자문 및 위탁개발 벤치마킹
 - 도시균형 발전 전문가 사례수집
 - 유사 정책추진 자치단체 사례수집
- 주민의견 수렴 : '14. 7. ~ ' 15. 6.

○ 2015년 이후

- 주민 및 전문가 의견수렴, 용역시행 : '15년 상반기
- 개발계획 수립 : '15년 하반기
- 사유지 매입추진(2015.~2016.) : 800백만원

□ 예상 문제점 및 대책

- 일반상업지역의 강남권 요충지역으로 토지가격이 고가에 형성되어 재산의 효율적 이용에 신중한 접근이 필요
⇒ 공공성과 경제성을 동시에 고려하여 추진
- 강남권 중심 교차로에 입지하였으나 유동인구가 많지 않아 이용도가 낮을 것으로 예상
⇒ 장래 송정택지 개발지구 개발후의 여건과 부합되는 개발이 필요

□ 기대효과

- 강남권 개발로 인한 거창읍 도시균형 발전 도모
- 거창군 진입대로변 요충지에 상징적 랜드마크 확보

5. 안전총괄과

거창 부르미 택시 도입

- ◇ 농어촌버스 미 운행지역 및 벽지노선 운행 주민의 이동권 보장
- ◇ 부르미 택시 도입에 따른 택시업계 경영개선 도모

사업개요

- 위 치 : 거창군 관내
(농어촌버스 미운행지역, 벽지노선 운행지역)
- 사업기간 : 2014~2018(계속)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'15	'16	'17	'18	임기이후
군 비	1,000	200	200	200	200	200

추진계획

- 2014년
 - 8. ~ 9. : 지원 근거 마련(조례 제정)
 - 9. ~ : 부르미 택시 운행계획 수립
- 2015년 이후
 - 1. : 부르미 택시 운행

예상 문제점 및 대책

- 농어촌 버스 수요자가 부르미 택시 이용에 따른 농어촌 버스 역할이 감소됨
⇒ 역할이 감소되는 농어촌버스 감차 및 노선(배차간격) 조정
- 부르미택시 활성화에 따른 주민들의 운행구간 확대요구
⇒ 운행구간의 구체적 기준 마련

기대효과

- 농어촌 버스 미 운행마을 주민들에 대한 이동 편의 증진 도모
- 승객 감소로 어려움을 겪는 지역 택시 운송사업자 경영개선

- ◇ 택시 감차를 통한 과잉 공급 구조개선 및 경쟁력 강화
- ◇ 택시업계 영업권 보장을 통한 택시 산업 발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사업량 : 택시 감차 55대(2014. 10대)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	1,239	239	200	200	200	200	200
국비	39	39					
도비		-					
군비	1,200	200	200	200	200	200	200
민자등		-					

□ 추진계획

- 2014년 택시 감차사업 추진에 따른 감차 10대
 - 7. : 감정평가 의뢰 (2개소, 택시영업권 등 감정평가)
 - 8. ~ : 계약에 따른 감차 보상 협의
- 2015년 이후
 - 제3차 택시 총량제 계획('15~'19)에 따른 연차별 감차 추진
 - 예정 감차대수 : 45대
 - 사업구역별 택시감차위원회 설치 및 운영
(감차대상 및 보상금 산정)

□ 예상 문제점 및 대책

- 2014년 감차보상사업 기준에 따라 감정평가 시 보상가격 (영업권 등)이 실 거래가와 큰 차이가 있을 시 감차 계약 어려움

⇒ 2015년부터 제3차 택시 총량제 계획 수립에 따른 감차 추진
『택시운송사업의 발전에 관한 법률』 등 관련 법규가 제정됨에
따라 택시 감차 보상 사업과 관련한 전반적인 기준 마련으로
현실에 맞는 감차계획 수립 및 추진

□ 기대효과

- 택시 감차로 인한 택시 업계 경영난 해소 및 경쟁력 강화

거창읍 교통체계 개편 및 주차난 해결

- ◇ 군민 생명과 재산 손실의 안정적 보호를 위한 교통인프라 구축
- ◇ 교통불편 해소 및 주차난 해결을 위한 이면도로 통행방법 개선

사업개요

- 위 치 : 거창읍 전역 (9개 권역으로 구분)
- 사업기간 : 2014~2018
- 사업량 : 이면도로 주차선 및 교통시설물 설치, 통행방법 개선
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	760	96	100	100	232	232	
군비	760	96	100	100	232	232	

추진계획

- 2014년 (상림리, 중앙리 일원)
 - 7. ~10. : 실시설계 및 주민설명 및 홍보(의견 수렴)
 - 10.~11. : 교통안전시설 심의회 및 일방통행 지정 신청
 - 11.~12. : 일방통행 지정 군민 홍보
- 2015년 이후 : 거창읍 교통체계 개선사업 기본계획에 의거 우선순위 권역별로 연차적 시행
 - 1. ~ : 상림리(4지역), 중앙리(5지역) 교통체계개선 시행

예상 문제점 및 대책

- 통행방법 개선 및 일방통행 지정에 따른 지역 주민 반발
⇒ 교통 흐름 원활 및 주차장 확보에 따른 주민 편의 설명

기대효과

- 교통소통 원활 및 주차 질서 확립
- 교통사고 예방 및 범죄예방

8-1	WHO 국제안전도시 공인 획득	안전관리담당
자체사업		940-3632

- ◇ 일상생활 중 발생하는 사고와 손상을 최소화하고 안전 증진 추진
- ◇ 국제안전도시 기반 구축으로 군민의 건강한 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업범위 : 거창군 일원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 6.
- 사업내용 : WHO 국제안전도시 공인 획득
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
계	225	110	20	25	40	30
국 비	40	40				
도 비						
군 비	185	70	20	25	40	30
민자 등						

※ 분야별 구체적인 사업예산은 별도

□ 추진계획

- 2014년
 - 안전도시 만들기 기본조사 용역 시행
 - 지역사회 손상자료 분석, 웹기반 손상감시시스템 구축
 - 안전도시 만들기 사업 추진을 위한 프로그램 개발
- 2015년 이후
 - 국제안전도시지원센터 업무협약
 - 안전도시 만들기 조례 제정 및 협의회 구성
 - 웹기반 손상감시시스템 운영
 - 분야별 안전도시 사업(프로그램) 추진

※ 사업 예시

- 가정안전분야 : 여성친화도시 조성 추진 등
- 학교안전분야 : 학교폭력 예방, 청소년 자살예방 프로그램
- 지역안전분야 : CCTV통합관제센터 운영 등
- 교통안전분야 : 어린이보호구역 안전환경 개선 등
- 산업안전분야 : 현장근로자 안전교육, 산재예방 교육서비스
- 화재안전분야 : 소방안전 프로그램
- 재난안전분야 : 재난안전네트워크, 안전점검, 훈련
- 고위험계층분야 : 독거노인, 중증장애인 지원사업
- 국내·외 안전도시 네트워크 활동
- 국제안전도시 공인 신청(2017년)
- 국제안전도시 공인 획득 및 지속관리

예상 문제점 및 대책

- 사업이 장기간 소요
- 분야별 안전도시사업 추진에 필요한 예산 적기 확보 문제
⇒ 공인 획득을 위해 기간내 사업예산 우선(적기) 배정 필요

기대효과

- 공인 획득과정에서 안전사고와 재난예방을 위한 환경 조성
- 안전·안심·안정된 지역사회를 만들기 위해 지역사회 구성원들이
합심하여 노력하는 안전공동체(Safe Community)형성

6. 승강기경제과

- ◇ 승강기는 국민편의시설로 건축물에 E/L 설치수요 급증
- ◇ 「기업·대학·R&D」와 관련기관 집적 등 기 구축된 산업진흥 인프라를 토대로 승강기산업 진흥의 중추적 기지로 육성 및 한국형 표준모델 「**거창** Elevator」 브랜드화로 글로벌 시장 진출(점유)

□ 사업개요

- 목 표 : **거창** Elevator 10개국 수출(연2천대, 1천억원)
- 사업기간 : 2014. ~ 2016.(3년)
- 사업량 : **거창** Elevator 신기술 개발 및 한국형 모델화(상용화), 미래형 승강기 R&D 지원, 글로벌 시장 마케팅 전자상거래 시스템 구축 및 수출지원, 국내·외 EXPO 참가
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17 이후
계	9,800	2,350	3,700	3,750	
국비	3,900	1,000	1,500	1,400	
도비	2,750	500	1,100	1,150	
군비	2,750	750	1,000	1,000	
민자 등	400	100	100	200	

- 사업주체 : 산업부, 경남도, 거창군(KTL, 경남TP, 대학, 선도기업체)

□ 추진계획

- 2014. 9. : 유망기업체 연구소 R&D센터 입주
- 2014. 9. : R&D 과제 공모 및 한국형 모델 개발
- 2014. 9. : 표준모델 pilot 생산설비 구축
- 2014. 10. : 한국형 표준모델 및 해외수출용 모델개발 및 인증
- 2014. 10. : 이라크 바스라 및 아랍권 수출용 E/L 개발·출시
- 2014. 10. : 2014 한국국제승강기엑스포 거창승강기밸리 참가
- 2015. 이후 : 글로벌 시장진출

□ 예상 문제점 및 대책

- 중국, 인도 등 개발도상국에 비해 인건비 상승으로 글로벌 시장 가격경쟁력 저하
⇒ 수출 인센티브 지원책(산업부 및 경남도) 강구 및
기차_{한국}Elevator의 기술·품질 우월성 중점홍보

□ 기대효과

- 기차_{한국}Elevator 한국형 모델화 및 상용화로 대외 경쟁력 향상
- 기차_{한국}Elevator 수주량 안정적 확보로 선도기업체 동반성장
- 거창 승강기밸리 인지도 향상으로 기업유치 가속화
- 세계 승강기시장에 대응할 수 있는 산업역량 확보

5-2
자체사업

승강기전문 농공단지 조성

투자유치담당
940-3362

- ◇ 승강기 관련 업종 집적화를 통해 승강기산업 허브 육성
- ◇ 공장입지 부족한 해소로 우량기업 투자유치, 계획적 체계적 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 경상남도 거창군 남상면 월평리, 대산리 일원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2016. 6.
- 면 적 : 320,280㎡ / 분양 200,064㎡ (96,885평/60519평)
⇒ 분양 200,064㎡(60,519평) : 산업시설192,975㎡, 지원시설 7,089㎡
- 개발방식 : 실수요자 개발방식
 - ❖ 민간시행사 : 부산시 소재 (주)산양종합개발 대표자 이인식
- 유치업종 : 기타기계 및 장비 제조업 , 전기장비제조업 등
- 분양금액 : ㎡당 / 119574원, 3.3㎡당 /395,286원
- 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16
계	29,900	8,612	4,209	12,000	5,079
국 비	6,882	6,673	209	-	-
도 비	484	484	-	-	-
군 비	1,455	1,455	-	-	-
민자 등	21,079	-	4,000	12,000	5,079

□ 추진계획

- 2014년
 - 2014. 05. 15 : 사업시행 협약 체결(산양종합건설)
 - 2014. 06. 10 : 사업이행보증(지급보증서) 제출
 - 2014. 06. 20 : 실시계획변경인가 및 시행자변경승인
(산양종합건설 ⇒ 거창군)
 - 2014. 07. : 공사착공

- 2015년 이후
 - 2015. 06. : 분양공고
 - 2016. 06. : 공사준공
 - 2016. 10. : 사업정산

예상 문제점 및 대책

- 국내외 경기침체와 제조업체 입지 기반이 취약한 지역한계로 투자기피
 - ⇒ 접근성, 관련업종 집적화로 물류비용 절감 및 산업용지 조기분양 대책강구

기대효과

- 친환경 건설기업 유치로 지역경제 활성화 및 인구 증대 기대
- 인구증가에 따른 농축산물 소비 촉진

5-8	전통시장 등 공동물류센터 건립	상공담당
자체사업		940-3372

◇ 전통시장 등 중소기업체가 공동구매·배송·판매할 수 있는 물류센터 건립 지원을 통해 유통 물류기능의 공동화·효율화 유도 및 중소기업체의 자생적 경쟁력 확보

사업개요

- 위 치 : 거창읍 지내
- 사업기간 : 2014. ~ 2017.
- 사업비 : 5,000백만원(국3,000 도750 군750 민자500)
- 사업량 : 공동물류센터 1식(3,000㎡)
 - 부지매입, 유통시설(배송장, 검품장, 보관창고, 저온창고 등)
 - 물류·판매시설 건립비, 장비구입

연도별 투자계획 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16이후
계	5,000		20		4,980
국비	3,000				3,000
도비	750				750
군비	750		20		730
민자 등	500				500

* 매칭 : 국60% 지방비30% 민간10%

연도별 추진계획

- 2014년
 - 우수물류센터 벤치마킹
 - 물류량 분석 등 「사업타당성 용역」 시행
- 2015년
 - '15. 2. : 사업 계획수립 및 사업신청(중기청)
- 2016년 이후
 - '16. 1. ~ : 사업부지 확보 등 사업시행

□ 예상 문제점 및 대책

- 현재 공동물류센터는 전국36개소(운영 27개소, 건립중 9개소)로, 전체가 시단위 이상에서 운영하고 있어, 군단위 경우 물류량 분석 등 신중한 검토가 요구됨
- 타 시·도의 경우 건립 후 인건비, 배송비 등의 지속적인 고정비용 발생 등에 따른 자금부족 및 운영부실 사례 빈번
⇒ 우수물류센터 벤치마킹 및 타당성 검토 용역시행으로 사업 추진 철저

□ 기대효과

- 유통단계 축소, 유통비용 절감, 공동구매 등을 실현하여 경쟁력 확보 및 골목상권 활성화에 기여

5-9
자체사업

중소기업육성기금 조성

투자유치담당
940-3363

- ◇ 중소기업 육성 및 발전에 필요한 자금의 확보와 효율적 지원
- ◇ 자금난으로 경영이 어려운 중소기업 사업자금 용자를 통한 경영활동 촉진

사업개요

- 사업기간 : 2007. ~ 2018.
- 사업량 : 용자 30억원(기업당 2억원 이내 이차보전 3%)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18
균비	10,000	5,300	500	1,000	1,000	1,000	1,200

추진계획

- 2014년 : 일반회계 500백만원 전출 완료
- 2015년 : 회계연도부터 일반회계 전입기금 확충(매년 1,000백만원)

예상 문제점 및 대책

- 2014년부터 용자실행에 대한 이차보전 지출이 있어 2015년부터 매년 10억원 이상 적립하여야만 임기내 목표액 100억 달성 가능

기대효과

- 기금 목표액 조기 달성을 통한 수혜기업 확대로 기업운영 활성화
- 목표액 100억 적립시 자금 회전을 향상으로 적정 운용 가능

7. 문화관광과

4-5	아홉산 선화공주 설화 콘텐츠 개발	문화예술담당
자체사업		940-3414

- ◇ 스토리텔링 사업을 통한 지역 역사문화의 관광 상품화
- ◇ 청정 거창의 이미지에 맞는 힐링전원타운 조성으로 귀촌인구 유입

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 상림리, 가지리 일원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2018. 12.
- 사업량
 - 귀촌인큐베이터 초가마을 : 초가30동, 텃밭 9,000m² 조성
 - 거열산성 역사문화체험장 : 둘레길, 주차장, 표지석 등
 - 문화콘텐츠 개발 : 희곡제작, 연극제작, 퍼포먼스 공연 제작 등
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17	'18
계	5,945	80	957	2,407	2,387	57	57
국 비	2,400	-	100	1,150	1,150		
도 비	50	20	30	-	-		
군 비	3,495	60	827	1,257	1,237	57	57
민자 등							

□ 추진계획

- 2014년
 - 귀촌인큐베이터 초가마을 선정여부 결정(7월), 사업대상지 선정
 - 거열산성 둘레길 1식, 주차장 토지수용 , 표지석 설치
 - 대표희곡제작, 낭독공연, 취우령제, SNS 페이지 제작 등
- 2015년 이후
 - 귀촌인큐베이터 초가마을 조성공사 (2015~16)
 - '15 : 도시계획 시설 결정 및 사업비 확보, 사업시행
 - '16 : 사업완료, 귀촌인 모집 홍보 및 시설운영 계획 수립
 - '17이후 : 시설물 임대 및 영농지도, 영화세트장, 테마관광지 활용

- 거열산성 역사문화체험장 조성
 - '14 ~ 15 : 주차장 , 탐방길, 표지석 조성 완료
- 문화콘텐츠 제작
 - '15 ~ 16 : 연극제작 및 무대상연(대학로, 거창)
 - '15 : 아홉산 메아리 퍼포먼스 제작
 - '16 : 산성교 빛과 소리극 제작

□ 예상 문제점 및 대책

- 귀촌인큐베이터 초가마을 조성, 콘텐츠 개발에 많은 예산수반
 - 지역행복생활권 공모사업에 선정 될 수 있도록 적극대응
- 연극, 퍼포먼스 등 문화콘텐츠 사업의 준비 부담을 최소화
 - 문화예술진흥원, 문화예술위원회 등 공모사업에 적극대응

□ 기대효과

- 국경 초가마을 조성으로 테마 관광지 및 영화 세트장으로 활용
- 관광자원 개발을 통한 유동인구 유입 및 지역경제 활성화
- 휴식·문화·관광의 거점공원화, 자연자원 등 문화와 역사체험

8. 산림복지과

4-3
자체사업

빼재 산림레포츠파크 조성

산림조성담당
940-3463

- ◇ 용도 폐지된 국도37호선을 활용한 백두대간권 생태복원 및 재활용 선도모델을 창출하고
- ◇ 무주스키장과 연계한 덕유산권 핵심 산악레저타운 조성으로 관광소득증대 등 시너지 효과 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 고제면 개명리 일원
- 사업기간 : 2014.~2017.(4년)
- 사 업 비 : 35,500백만원
(국비 17,450, 도비 5,115, 군비 11,935)
- 주요 사업내용
 - 스피드익스트림타운 조성 : 봅슬레이, 모노레일, 숲 체험시설 등
 - 백두대간생태교육장 조성 : 부지 9,908㎡, 건축연면적 1,810㎡
 - 거함산 향노화 체험단지 조성 : 산양삼 체험단지, 향노화체험길, 빼재캠핑장
- 사 업 비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17
계	35,500	400	6,300	8,460	13,240	7,100
국 비	17,450	400	3,150	4,230	6,620	3,050
도 비	5,115	-	945	1,265	1,990	915
군 비	11,935	-	2,205	2,965	4,630	3,135

※ 백두대간 생태교육장 100억(기투자/4억, 14년/53억, 15년/43억)
 스피드익스트림 117억(14년/10억, 15년/35억6천, 16년 이후/71억4천)
 거함산 향노화 체험단지 128억(15년/6억, 16년/61억, 17년/61억)

□ 추진계획

○ 2014년

- '14. 6. : 백두대간 생태교육장 조성사업 착수(18개월)
- '14. 6. : 볍슬레이 설치에 따른 폐도활용 협의
(L=1.7km /부산 지방국토관리청, 경상남도)
- '14. 7. : 스피드익스트림조성에 따른 인허가 및 설계용역 실시
※ 사업면적 : 41ha(자연휴양림 지정 35ha, 군계획시설 6ha)
- '14. 7. : 거함산 향노화 체험지구 조성사업 투융자 심사

○ 2015년 이후

- '15. 1. : 백두대간 생태교육장 전시시설 용역실시
(총공사비 20억 정도)
- '15. 3. : 거함산 향노화 체험지구 조성사업 실시설계 추진
- '15. 12. : 스피드익스트림 조성사업 설계용역 및 행정협의
- '17. 12. : 사업완료(백두대간 생태교육장, 스피드익스트림타운, 거함산 향노화 체험단지)

□ 예상 문제점 및 대책

- 국·도비 예산의 계획적 배정이 되지 않을시 계획기간내(2017년) 준공불가
⇒ 연차별 예산 확보를 위한 상급부서 방문 및 정관계 등 인적 네트워크를 활용, 조력 역할 작동
- 거창(지방)&세계 경쟁시설 및 운영프로그램 개발 국내 지식 정보 한계 ⇒ 해외 선진 벤치마킹 접목

□ 기대효과

- 백두대간 폐도 주변 생태환경 복원과 체험단지 조성으로 지역 자원 홍보 및 주민소득 증대
- 산림레포츠파크 조성으로 사계절 관광인구 유입에 따른 지역경제 활성화

4-4
자체사업

향노화 힐링랜드 조성

공원녹지담당
940-3482

◇ 거창군의 명품 산과 최고 품질의 온천, 거창스토리텔링 자원을 연계한 전국 유일의 사계절 힐링랜드를 조성하여 향노화의 메카로 자리매김 하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 가조면 수월리 산19번지 일원
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년)
- 주요사업내용
 - 향노화 힐링단지 : 치유의 숲, 자연휴양림, 산림복지단지, 온천스파 등
 - 연구단지 조성 : 향노화연구단지, 종자은행, 학술림, 수련관 등
- 사업비 확보계획 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	내 용	비고
계	49,800		
치유의 숲	4,800	숲체험장, 치유숲길, 경관조망대 등	확보
산림복지단지	30,000	'15. 산림청 시범사업 신청 예정	
자연휴양림	5,000	'15. 상반기 자연휴양림 지정 추진	
민자 등	10,000	'13. 8. 향노화 기반구축관련 부산대 MOU협약	

- 사업비 구분 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17	'18 이후
계	49,800	-	1,100	3,500	9,600	16,200	19,400
국 비	19,900	-	200	1,250	3,800	6,650	8,000
도 비	5,970	-	60	375	1,140	1,995	2,400
군 비	13,930	-	840	875	2,660	4,555	5,000
민자 등	10,000	-	-	1,000	2,000	3,000	4,000

□ 추진계획

○ 2014년

- '14. 4. : 향노화 치유단지 종합기본계획 및 치유의 숲 실시
설계용역(산림조합중앙회, 용역기간 12개월)
- '14. 7. : 향노화 힐링랜드 조성사업 주민협의체 구성
- '14. 8. ~ : 용역 설명회 및 의견수렴(주민협의체 등)
- '14. 9. : 향노화치유단지 종합기본계획 수립용역 중간보고회
- '14. 10. : 토지매입(사유지) 및 보상 추진
- '14. 10. : 문화재 지표조사 및 소규모환경영향평가
- '14. 하반기 : 산림복지단지(2015년 산림청 시범사업) 신청예정
- '14. 11. ~ : 연차별 예산확보

○ 2015년 이후

- '15. 상반기 : 자연휴양림 지정 추진
- '15. 5. ~ '17. 12. : 치유의 숲 조성공사
- '17. 6. : 치유의 숲 시범운영
- '17. 12. : 치유의 숲 사업완료
- '18. 12. : 향노화 힐링랜드 조성사업 완료

□ 예상 문제점 및 대책

- 산림복지단지 조성사업(2015년 산림청 시범사업/300억) 미확정
⇒ 현 「관련특별법」 발의, 국회 계류중, 선제적 대응 및 정책
적 지원 관철
- 국도비 예산 확보 및 민간자본유치가 본 사업의 완성도를 결정
⇒ 산림청 「산림복지단지」 사업 선정 및 자연휴양림지정, 개
발촉진지구지정 등을 통한 사업비 확보
- 사유토지 매입관련 보상협의 난항 시 도시계획시설이 아닌 관
계로 토지수용 추진 불가
⇒ 사업추진의 필요성과 당위성을 부각시켜 지속적인 협의 추진

- 권역 최고의 임상 및 전통사찰 등 산림훼손으로 인한 환경단체 반대 우려
⇒ 환경 친화적 시설 및 산림휴양문화 뉴 프로그램 개발 운영
- 사업완성도 및 협상력 제고를 위하여 다양한 의견수렴 필요
⇒ 기본계획 수립 단계부터 주민협의체, 창조발전협의회 등 의견수렴 및 전문가 자문을 통한 디자인 및 설계반영

□ 기대효과

- 치유의 메카 「거창」 : 향노화 힐링랜드 조성으로 휴양과 치유, 건강, 향노화의 메카로 자리매김
- 치유수요 대처 : 전국적으로 급증하는 산림휴양과 산림치유의 수요에 대처를 통한 지역경제 활성화
- 거창군 브랜드 가치 상승 : 온천, 골프장, 창포원, 스피드익스트림타운, SLR관측국 등 스토리텔링 자원연계를 통한 시너지 효과 창출

◇ 생활권 주변에 방치되어 있는 자투리 땅을 포켓공원으로 조성하여 군민에게 쾌적한 생활환경 제공 및 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 일원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2017. 12.
- 사업량 : 45개소, 3,982㎡
- 주요사업내용
 - 식재수종 : 수관폭이 넓어 여름철 녹음을 줄 수 있으며, 병충해 및 도시환경 오염에 강한 수종
 - 예) 교목 : 소나무, 느티나무, 산딸나무 등
 - 관목 : 영산홍, 철쭉, 회양목 등
 - 식재규격 : 중경목 위주 식재
 - 편의시설 : 등의자, 원두막 등
 - 운동기구 : 하늘걸기, 철봉 등
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17
계	5,120	600	1,130	1,130	2,260
국비	500	100	100	100	200
도비	150	30	30	30	60
군비	4,470	470	1,000	1,000	2,000
민자 등					

□ 추진계획

- 2014년
 - 사업량 : 12개소, 795㎡
 - '14. 7. : 실시설계, 사업착공
 - '14. 7~9. : 2015년 이후 사업대상지 파악
 - '14. 10. : 사업준공, 공유재산 관리계획 반영

○ 2015년 이후

- 사업량 : 33개소, 3,187m²
- '15. 1~2. : 2016년 이후 사업대상지 조사
- '15. 2. : 자투리땅 용역 실시
- '15. 3~5. : 자투리땅 실시설계
- '15. 10. : 공유재산 관리계획 반영

□ **예상 문제점 및 대책**

- 토지 소유자 매각 불가시 사업 추진 애로
 - 지속적 협의 및 사업 추진 당위성 설명 매각 유도
- 교목(큰나무) 식재시 연접지 주민 민원 발생
 - 중대규모 부지 큰나무 식재
 - 소규모 부지 관목(키 작은나무) 식재
 - 시설물(의자, 파고라) 배치로 쉼터 공간 창출

□ **기대효과**

- 도심속 미관을 해치는 자투리땅을 포켓공원 조성으로 깨끗한 가로환경 제공 및 주민들의 쉼터 조성
- 공공사업이후 방치되고 있는 자투리땅을 매입 활용함으로써 사회적 효용가치 증대
- 녹지공간 조성으로 저탄소 녹색도시 거창군 이미지 제고

9. 녹색환경과

4-1
자체사업

거창 창포원 조성

환경정비담당
940-3502

◇ 댐주변 친수공간 조성 및 생태환경 개선으로 서부경남의 새로운 수생태 관광거점 육성으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 거창군 남상면 대산리 및 월평리 일원
- 사업기간 : 2014. ~ 2016.(3년간)
- 투자계획 (단위 : 백만원)

구 분	총계	기 투자	2014년	2015년	2016년
계	23,036	3,749	5,020	4,472	9,795
국 비	9,650	1,149	1,942	1,943	4,616
도 비	2,195	500	300	300	1,095
군 비	10,055	2,100	1,642	2,229	4,084
기 금	1,136	-	1,136	-	-

- 사업내용
 - 대산지구 농촌테마공원 조성사업(수몰지구밖) : 39,034.8m²
 - 사 업 비 : 11,736백만원
(국비 4,000, 도비 500, 군비 6,100, 기금 1,136)
 - 주요시설 : 방문자센터, 창포식물원, 야외공연장, 친환경주차장 등
 - 감악산 수변생태공원 조성사업(수몰지구내) : 386,170m²
 - 사 업 비 : 11,300백만원
(국비 5,650, 도비 1,695, 군비 3,955)
 - 주요시설 : 다목적광장, 꽃창포원, 연꽃원, 습지원

□ 추진계획

○ 2014년

- 대산지구 농촌테마공원 조성사업(수몰지구밖)
 - '14. 6. : 부지 매입 및 이전등기
 - '14. 7. : 공원조성계획 결정
 - '14. 8. : 실시계획 인가 및 사업착공(예정)
- 감악산 수변생태공원 조성사업(수몰지구내)
 - '14. 7. ~ 9. : 설계VE 및 경남도 건설기술심의
 - '14. 8. ~ 9. : 하천점용허가
 - '14. 10. : 사업착공(예정)

○ 2015년 이후

- 대산지구 농촌테마공원 조성사업(수몰지구밖)
 - 농림축산식품부로부터 예산지원이 확정된 사업으로 연차별 투자계획에 따라 예산 확보
- 감악산 수변생태공원 조성사업(수몰지구내)
 - 문화관광체육부의 생태녹색관광자원화 사업에 반영하여 연차별 투자계획에 따라 예산 확보

□ 예상 문제점 및 대책

- 문화재표본조사결과 유구 출토로 정밀 발굴조사 진행시 사업 준공기한 연장 불가피
 - ⇒ 기존 농지 성토 후 공원 조성시 정밀 발굴조사 유예 가능 여부 문화재청과 협의

□ 기대효과

- 도시민을 위한 휴식·레저 공간 및 지역주민 소득 연계 기반 조성
- 생태녹색 관광자원화로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

에코 에너지파크 조성

◇ 스포츠파크와 환경기초시설 일원에 설치 가능한 모든 신·재생 에너지 시설을 설치하여 신·재생 에너지 교육장으로 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 스포츠파크, 폐기물 처리장, 하수종말처리장, 생태학습장, 양향제 생태습지원, 창포원 일원
- 사업기간 : 2013. 10. ~ 2015. 12.
- 규 모 : 47ha
- 내 용 : 에코에너지학습장, 태양열·태양광발전시설, 소풍력발전시설, 소수력발전시설, 빗물재활용시설, 재활용 정크아트 설치 등

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15
계	2,578		2,178	400
국 비	2,178		2,178	
도 비				
군 비	400			400
민자 등				

□ 추진사항

- 2013. 1. 31 : 주민지원사업 특별지원 공모사업
- 2013. 5. 31 : 사업비 확정(1회 추경, 1,000백만원)
- 2013. 6. 17 : 사업계획변경 승인 요청(거창군⇒낙동강유역환경청)
 - ※ 사업비 변경 : 1,000백만원 ⇒ 2,178백만원
- 2013. 10. 18 : 사업계획 변경에 따른 예산 확정(2회 추경)
- 2013. 12. 11: 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역 의뢰

□ 추진계획

○ 2014년

- 2014. 3. 18 ~ 8 .17 : 타당성 조사 및 기본구상 수립 용역 시행
- 2014. 6. : 기본구상 및 도입시설 초안작업 완료 및 협의
타당성 및 기본구상 중간보고 등
- 2014. 8. : 용역결과 납품 및 최종 보고회
- 2014. 9. ~ 10. : 실시설계
- 2014. 11. : 계약심사
- 2014. 11. : 계약 및 착공

○ 2015년 이후

- 2015. 10. : 1차 준공
- 2015. 11. 이후 : 용역 결과에 따른 추가 시설 설치

□ 문제점 및 대책

- 용역 결과에 따른 시설 사업비 일부 부족 예상(4억원 정도)
⇒ 예산 확보 후 단계별 시행

□ 기대효과

- 신·재생에너지 시설과 재활용 시설을 연계한 환경공원 조성이
완료되면 에코에너지 체험·교육 및 관광객과 연계한 체계적 운영
으로 홍보 효과 제고
- 에코 에너지 파크의 체험 및 교육의 효율적 운영에 따라 에너지
절감 및 신재생 에너지 생산 확대로 녹색 성장 제고

○ 2015년 이후

- 도랑 살리기 사업 우선순위에 따라 시행 : 2015.~2018.
- 기금 및 국·도비 지원 사업 : 매년 3개소 이상, 90백만원 이상
- 군비 지원사업 : 매년 4개소 이상, 120백만원 이상

□ **예상 문제점 및 대책**

- 도랑 살리기 사업의 핵심은 주민의식개혁에 있으므로, 환경에 대한 열정을 가진 마을내 환경리더 발굴과 주민의식교육이 중요함
- 주민의식이 변화되지 않을 경우에는 도랑살리기 사업의 효과가 감소될 우려가 있음
- 민간환경전문단체 주민교육강화 프로그램 요청
- 관내 환경단체 주민의식교육담당 인재육성 유도
- 친환경·친수공간 조성에 따른 인센티브 제공

□ **기대효과**

- 낙동강 수질개선 및 수생태계 복원
- 환경에 대한 주민의식개혁
- 마을주민의 삶의 질 향상 및 마을 공동체 정신 회복

10. 건설과

6-5	지방도 남상~가북 구간 조기완공	도로담당
자체사업		940-3552

- ◇ 지역경제활성화와 낙후된 지역개발촉진 및 교통사고 예방을 위함
- ◇ 주요간선도로의 확포장으로 우리군의 균형발전에 기여

사업개요

- 위 치 : 거창군 남상면, 남하면, 가조면, 가북면 일원
- 사업기간 : 2009. 06.~2017. 06.
- ※ 예산확보 및 기타사항으로 공기연장(3.간)
- 사업량 : 도로확포장L=23.5km, B=9.5m
- 사업비 : 685억원

노선명	구간별	사업량	사업비(억원)				
			합계	기시행	2014년	2015년	2016년이후
계		L=23.5km	685	387	71	150	77
지1089	남하~가조 (1공구)	L=3.1km B=9.5m	140	76	17	47	-
지1099	남하~가조 (2공구)	L=5.7km B=9.5m	169	68	15	43	43
	장기~우혜	L=7.7km B=9.5m	211	123	20	34	34
지1084	거창~춘전	L=7.0km B=9.5m	165	120	19	26	-

추진계획

- 2014. 08 : 2015년 예산반영 건의(경상남도)
- 2017. 06 : 사업 준공

예산 문제점 및 대책

- 예산부족으로 당초계획 한 기간 내 준공 차질
⇒ 시행청인 경상남도에 지속적인 건의

기대효과

- 편리하고 안전한 도로망의 조기구축으로 안전한 교통체계 확립
- 우리군의 균형발전을 위한 기반시설의 구축

6-6	군도4호선(병곡~산수)확포장사업	도로담당
자체사업		940-3552

◇ 북상면 병곡마을~산수마을구간의 노폭협소로 상존하는 사고 위험을 제거하고 원활한 교통소통과 주민생활 불편해소

사업개요

- 위 치 : 거창군 북상면 병곡~산수
- 사업기간 : 2013.02 ~ 2015.12
- 사업량 : 도로확장L=3.52km
- 사업비 : 4,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16
계	4,600	100	2,000	2,500	
군 비	4,600	100	2,000	2,500	

추진계획

- 2014. 07. : 보상협의 중(35%)
- 2014. 10. : 사업 착수(2015. 12월 준공예정)

예상 문제점 및 대책

- 현재 편입토지 및 지장물건에 대한 보상협의 중에 있으나, 일부 주민의 보상단가 불만으로 협의에 어려움이 있음
⇒ 지속적인 보상협의 독려로 조기착공 실시
- 사업구간이 길어 사업시행 시 주민통행 불편에 따른 민원사항 다소 발생예상
⇒ 농번기 및 다수이용시기를 피해 시공

기대효과

- 주민과 관광지를 찾는 관광객의 불편사항을 해소
- 안전한 경작활동과 거창관광의 이미지제고

6-8
자체사업

거창 남부 우회도로 개설사업

도로담당
940-3552

◇ 거창읍 강남지역을 관통하고 있는 국도24호선은 김천, 무주, 인근 합천, 함양을 연결하는 교통의 요충지로 극심한 교통체증 및 사고 위험 상존.

◇ 군민의 불편해소 및 교통사고예방과 문화센터 및 거창대학이 소재한 강남 지역의 균형발전.

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 대평리~송정리
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년간)
- 사업량 : 도로개설 L=2.8km, B=35.0m
- 사업비 : 42,000백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18
계	42,000		2,000	20,000	20,000	
국비	42,000		2,000	20,000	20,000	
도비						
군비						
민자 등						

□ 추진계획

- 2014년
 - 2014. 2.~5. : 국도24호선 우회도로 지정 및 개설 건의 (국토교통부, 국토연구원, 경남도)
 - 2014. 5. : 제4차 국도건설 5개년('16~'20년)계획 타당성조사 용역 수행 중(국토연구원)
 - 2014. 12. : 타당성조사 용역 완료 예정
- 2015년 이후
 - 2015. 12. : 제4차 국도건설 5개년('16~'20년)계획 사업대상지 확정

- 2016. 3. : 실시설계 용역
- 2016. 7. : 공사착공(준공예정 '18.12)

예상 문제점 및 대책

- 사업의 타당성검토 용역중이나 사업 확정시 까지는 장기간 소요
(2015년 12월경)됨
⇒ 국회차원에서 사업당위성 설명 및 지속적인 협의

기대효과

- 시내를 통과하는 기존국도의 교통체증과 사고위험을 미연에 방지
- 관광 성수기 우리군을 찾는 관광객으로 인한 지역주민의 불편해소
- 우리군의 균형발전을 위한 기반시설의 구축

6-10	고향의 강 조성사업 조기완공	하천담당
자체사업		940-3642

◇ 하천과 연계한 지역의 사회·문화·환경특성에 부합되는 특화계획 수립
 ◇ 쾌적한 여가 공간조성과 지역환경 개선을 통한 관광휴양지 개발로 인근 대도시 인구 유입 및 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 건계정 ~ 위천면 수송대
- 사업기간 : 2013.01. ~ 2018.12.(5년)
- 사업량 : L=9.88km(제방 6.4km, 보개량 13개소, 자전거도로 1식)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18
계	23,535	2,133	833	6,857	6,857	3,428	3,427
국비	14,121	1,280	500	4,114	4,114	2,057	2,056
도비	2,824	256	100	823	823	411	411
군비	6,590	597	233	1,920	1,920	960	960

□ 추진계획

- 2014년
 - '14.10.20 : 실시설계 완료 및 행정절차 이행
 - '14.11.01 : 입찰 및 계약
 - '14.12.01 : 지적분할 및 보상추진
- 2015년 이후
 - 제방축제
 - 보 개량 및 어도설치
 - 자전거도로 개설
 - 친수 및 생태공간 조성
 - '18.12.30 : 준공

□ 예상 문제점 및 대책

- 1990년 하천기본계획 수립시 고수부지 및 하상 준설 등으로 계획하였으나, 현재 부산청에서 수립하는 기본계획에는 고수부지 및 하상구조물 철거없이 보축 및 축제를 계획하고 있기에,
- 기 수립된 계획 대비 금회 홍수위가 1m이상 상향 조정됨에 따른 치수계획 증가로 당초 사업비보다 93억원이 증가되는 실정임.
⇒ 사업의 원활한 추진을 위하여 국토교통부와
총액변경 협의추진으로 충분한 예산 확보 계획

□ 기대효과

- 재해에 안전하고 유량이 풍부한 안전한 강 조성
- 문화적 요소를 적극 가미한 테마하천 조성
- 지역 축제와 연계하여 고향의 강 테마형 관광벨트 조성
- 지역주민의 애향심을 고취시키는 참여의 강 조성

□ 예상 문제점 및 대책

- 하천 수생태계 파괴논란으로 시민단체의 간섭 우려
⇒ 사전 환경영향평가를 실시하고, 설계전반에 대하여
시민단체의 건전한 의견수렴 및 반영
- 국비확보의 어려움
⇒ 국토교통부와 기재부의 신규사업 규제로 국비확보에 어려움이
있으나, 긴밀한 협조체제 구축으로 '15년도 국비확보에 총력

□ 기대효과

- 재해에 안전하고 유량이 풍부한 안전한 강 조성
- 거창상수도 취수원의 수질오염 예방
- 노후된 하천시설물의 개·보수로 사전 재해예방
- 하천 환경개선으로 군민의 삶의 질 향상
- 준설된 퇴적토의 재활용으로 부족한 골재난 해소

6-12	함양~울산간 고속도로 조기 착공	도로담당
자체사업		940-3552

- ◇ 영호남 연결의 국가동맥도로망 구축으로 인적·물적 교류 촉진
- ◇ 미래 거창을 담보하는 최대의 현안사업

□ 사업개요

- 위 치 : 함양~거창~합천~의령~창녕~밀양~울산
- 사업기간 : 2013. ~ 2019.(7년)
- 사업량 : L=144.8km, B=23.4m(4차로)/거창군간 11.79km
(함양~밀양 101.2km, 밀양~울산 43.6km)
- 사업비 : 5조8,862억원 정도
(함양~밀양 4조1,138억원, 밀양~울산 1조7,724억)

(단위 : 억원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	입기후
계	58,862	2,016	698	8,504	11,911	11,911	11,911	11,911
국비	58,862	2,016	698	8,504	11,911	11,911	11,911	11,911

□ 추진계획

- 2014년
 - 2014. 05. : 2015년 예산확보 및 조기시행 건의(국토부)
 - 2014. 12. : 기본 및 실시설계완료 예정
- 2015년 이후
 - 2015. 1.~12. : 보상협의
 - 2015. 08. : 사업착수(2019년 준공예정)

□ 예상 문제점 및 대책

- 신규 사업구간으로서 기재부와 예산협의 단계이며 신규사업에 대한 사업비확보 애로
⇒ 국회차원에서 사업당위성 설명과 예산확보 추진

□ 기대효과

- 편리하고 안전한 도로망의 조기구축으로 안전한 교통체계 확립
- “거창한거창” 이미지 제고

7-5	88고속도로 거창관문 조성사업	도로담당
자체사업		940-3552

- ◇ 88고속도 진출입로와 국도(24,26호선) 접속교차로 교통체계의 개선
- ◇ 거창을 찾는 탐방객의 만남의장 제공으로 편의도모 및 이미지 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 경상남도 거창군 거창읍 88고속도로 진출입부 국도(24호선, 26호선)노선구간
- 사업량
 - 회전교차로 : R=60m(2차로)
 - 만남의광장 : A=15,000㎡(휴게시설, 농산물판매시설, 주차장 등)
- 사업기간 : 2014. 08. ~ 2017. 05.
- 사업비(추정) : 7,000백만원(공사3,850 보상2,850 기타300)
(단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17
계	7,000		3,150	3,850	
국 비	3,500		1,500	2,000	
도 비	1,725		825	900	
군 비	1,775		825	950	
민자 등					

□ 추진계획

- 2014년
 - 2014. 06. : 군계획 재정비 반영(광장)
 - 2014. 07. : 사업지원 건의(경상남도, 안전행정부, 건설교통부)
- 2015년 이후
 - 2015. 02. : 군계획시설 결정 및 지형도면 고시
 - 2015. 03. : 실시계획 용역착수
 - 2015. 12. : 사업착수(준공예정:2017. 05)

□ 예상 문제점 및 대책

- 국도병목지점 개량사업 기본계획(2013~2017년)에 미 반영된 사업임으로 국토청과 국토부에 사업반영 건의
- 88고속도로 확포장공사시 교차로개선사업 병행추진 건의
⇒ 지속적인 보조사업 신청 등 중앙부처 지속협의

□ 기대효과

- 88고속도로의 준공으로 늘어나는 교통량을 소화하고 안전한 교통체계의 구축.
- 거창의 관문조성으로 “거창韓거창” 이미지 제고

11. 도시건축과

3-2
자체사업

아카데미파크웨이 조성

도시개발담당
940-3592

- ◇ 학교주변에 역사·문화시설등이 인접하고 있어 지역의 경관적 잠재력개발 건강한 자연환경의 쾌적한 녹색교육단지조성과
- ◇ 공공건축과 공공공간을 유기적으로 통합하여 자연생태환경이 함께하는 체험과 교육이 있는 친환경 교육의장마련

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 상림리, 중앙리, 가지리 일원
- 사업량
 - 아카데미파크웨이조성(4개 단위사업) : L=2.4km
 - 녹색성장사업(3개 단위사업)
 - ▶ 태양광설치 : 4,490㎡ ▶ 벽면녹화사업 : 2개교/680㎡
 - 초중등교 리모델링(4개 단위사업)
 - ▶ 리모델링 : 8개교/27,240㎡ ▶ 케노피 : 3개교/980㎡
- 사업기간 : 2013. ~ 2017.
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17
계	17,818	950	1,093	7,163	5,323	3,289
국 비	7,488	850	450	3,447	2,082	659
도 비	4,243			1,542	1,442	1,259
군 비	6,087	100	643	2,174	1,799	1,371

□ 추진상황

- 2014. 02. : 농촌중심지활성화 선도지구사업 신청
- 2014. 05. : 사업수행능력평가서 도 건설기술심의
- 2014. 06. : 실시설계용역업체 선정 및 설계착공

추진계획

- 2014. 07. ~ 2015. 07. : 실시설계용역
- 2014. 08. : 아카데미파크조성사업 착공
- 2017. 12. : 사업완료

예상 문제점 및 대책

- 사업비 총액규모가 큰 사업으로 예산확보대책 필요
⇒ 국토교통부, 농림축산식품부, 도재정지원건의 등 국·도비
예산확보총력

기대효과

- 아카데미파크 내 신재생에너지사업 시범실시 에너지 자립도시
기틀마련과 관련기업유치로 지역경제 활성화
- 도로 등 공공공간에 토탈디자인을 적용한 아카데미파크웨이를
조성 공연·학습·소통이 어우러진 다목적교육단지로 활용

4-9	월성·수승대권 트레킹코스 개발	도시개발담당
자체사업		940-3592

- ◇ 월성·수승대권에 산재한 관광시설과 연계하여 관광 루트화함으로써 지역활성화 도모와,
- ◇ 지역의 우수한 자연환경과 다양한 역사 문화자원을 활용하여 신개념의 지속가능한 발전 모델 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 위천면, 북상면 일원
- 사업량 : 트레킹코스 L=40km B=3~5m
- 사업기간 : 2012. ~ 2019.
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18
계	5,120	849	400	50	100	1,721	2,000
국비	5,120	849	400	50	100	1,721	2,000

□ 추진상황

- 2010. 06. : 중앙도시계획위원회 심의
- 2010. 11. : 개발촉진지구확정 지정고시 ⇒ 63.80km²
- 2011. 01. : 개발계획 승인 고시
- 2011. 10. : 실시설계용역 착공
- 2013. 04. : 개발촉진지구개발사업 국토교통부 변경승인
※ 사업변경승인(예산40억증, 사업물량 추가)
- 2014. 05. : 실시설계 완료

□ 추진계획

- 2014. 10. : 공사추진계획수립 및 착공

○ 2019. 12. : 공사완료 예정

□ 예상 문제점 및 대책

○ 지역발전특별회계 도자율편성 예산으로 년도별 계획된
사업비확보 애로

⇒ 국토교통부, 도 담당부서와 유기적인 협조체계구축 예산
확보에 총력

□ 기대효과

○ 생활환경·생산기반조성을 통한 정주환경 등 생활여건개선

○ 관광산업과 특화산업을 유기적으로 연결 개발 지역경제 활성화 도모

◇ 가야문화권 특정지구 개발계획에 따른 우수한 문화·관광자원의 종합개발을 통한 지역경제 활성화와,
 ◇ 북부우회도로 개설을 통한 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 상림리 ~ 대평리 일원
- 사업량 : 도로개설 L=4.0km B=20m
- 사업기간 : 2012. ~ 2019.
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	28,400	2,166	3,000	2,234	4,500	6,000	4,900	5,600
국비	23,200	1,200		1,000	4,500	6,000	4,900	5,600
도비								
군비	5,200	966	3,000	1,234				
민자 등								

□ 추진상황

- 2012. 07. : 사업대상지 변경신청⇒국토교통부 8. 승인
 ※ 금원산휴양림진입도로개설 ⇒ 거열산성진입도로개설
- 2013. 01. : 실시설계용역 착공
- 2014. 01. : 설계경제성검토 및 문화재 지표조사 완료
- 2014. 05. : 설계완료 및 보상계획공고

□ 추진계획

- 2014. 06. : 편입지장물건 보상협의(상림리~가지리 구간)
- 2014. 07. : 사업계획변경신청 ⇒ 국토교통부
 ※ 사업량/사업비 증가에 따른 계획변경신청
- 2015. 01. : 공사추진계획수립 및 착공
- 2019. 12. : 공사완료 예정

□ 예상 문제점 및 대책

- 국토교통부승인 사업계획초과(38,000 ⇒ 46,700백만원)에 따른 계획변경승인신청
⇒ 사업계획변경의 타당성등 방문설명 계획변경조치
- 지역발전특별회계 도자율편성예산, 총액규모가 큰 사업으로 예산확보 애로
⇒ 국토교통부, 도 담당부서와 유기적인 협조체계구축 연도별 계획된 예산확보에 총력

□ 기대효과

- 관광자원 인프라구축 지역균형발전과 경제 활성화 도모

6-3
자체사업

제6교(가칭) 가설

도시개발담당
940-3592

◇ 가야문화권 특정지구 개발계획에 따른 북부우회도로 연결교량 제6교(가칭)가설을 통한 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 위치 : 거창군 거창읍 상림리 ~ 대평리 일원
- 사업량 : 교량가설 L=200m B=20m 접속도로 L=500m
- 사업기간 : 2012. ~ 2019.
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	18,300		500	6,300	4,500	4,000	3,000
국비	16,300			4,800	4,500	4,000	3,000
도비							
군비	2,000		500	1,500			
민자등							

□ 추진상황

- 2012. 07. : 사업대상지 변경신청⇒국토교통부 8월 승인
 - ※ 금원산휴양림진입도로개설 ⇒ 거열산성진입도로개설
- 2013. 01. : 실시설계용역 착공
- 2014. 01. : 설계경제성검토 완료

□ 추진계획

- 2014. 07. : 사업계획변경신청 ⇒ 국토교통부
 - ※ 사업량/사업비 증가에 따른 계획변경신청
- 2016. 01. : 공사추진계획수립 및 착공
- 2019. 12. : 공사완료 예정

예상 문제점 및 대책

- 지역발전특별회계 도자율편성예산, 총액규모가 큰 사업으로 예산확보 애로
- ⇒ 국토교통부, 도 담당부서와 유기적인 협조체계구축 연도 별 계획된 예산확보에 총력

기대효과

- 관광자원 인프라구축 지역균형발전과 경제 활성화 도모

7-1	거창읍 중앙로(로터리~대동리) 도로환경정비	도시개발담당
자체사업		940-3592

◇ 거창읍 중앙로는 군민의 통행이 많은 중요도로로 보도의 설치
연한경과 노면요철, 훼손등 보행환경이 매우 불량한 구간으로,
◇ 도시환경개선을 위한 보행로 정비사업이 시급한 실정임

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 중앙리 일원
- 사업량
 - 보도정비 L=1,000m(양안) B=3m
 - 전선지중화사업 L=550m
- 사업기간 : 2014. ~ 2016.
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	4,300		2,500	1,800			
국 비							
도 비							
군 비	4,300		2,500	1,800			
민자 등							

□ 추진계획

- 2014. 07. : 사업추진계획수립
- 2014. 10. : 예산신청(군 자체예산)
- 2014. 11. : 한전과 중앙로 전선지중화사업 업무협약체결
- 2014. 12. : 실시설계용역 착공
- 2015. 03. : 전선지중화사업 착공
- 2015. 08. : 보도정비사업 착공
- 2016. 06. : 중앙로 도로환경정비사업 완료

예상 문제점 및 대책

- 전선지중화에 따른 개폐기, 변압기 34개소로 자기 상가앞 설치반대 장소확보애로
⇒ 중앙리 상가협회의 협조 설득을 통한 적의설치장소 확보

기대효과

- 보행자의 교통안전 확보와 쾌적한 도시환경조성

12. 농업기술센터

1-1	농산물 종합가공지원센터 건립	식품가공담당
자체사업		940-8152

- ◇ 농업인의 가공 창업의지가 강하나 창업비용 부담, 가공기술력 부족, 제조판매에 따른 행정절차와 관련법규에 취약
- ◇ 농산물 가공공동시설 설치, 창업코칭 등 중·소 농가의 소규모 가공창업을 종합적으로 지원함으로써 농외소득 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 대평리 1362번지(농업기술센터 내)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2015. 12.(2년간)
- 사업량 : 연면적 1,000㎡정도(공동가공시설(1층)+창업보육(2층))
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15
계	2,500	-	500	2,000
국비	850	-	250(250)	600(250)
군비	1,650	-	250(250)	1,400(250)

※ ()는 기확보액 1,000백만원('14년 500백만원 / '15년 500백만원)

□ 추진현황

< 기반구축 >

- 공모 선정 : 2014. 1. 21
- 가공품목 및 유형 선정을 위한 2차 수요조사 : 2. 27 ~ 3. 31
- 사업부지 협의 및 선정 : 3. 4
- 농산물 종합가공지원센터 기본계획 수립 : 3. 6
- 농산물 가공 연구회 조직 : 3. 11
- 분야별 전문가 운영자문단 구성(10명) : 6. 17

< 행정절차 이행 >

- 지방재정 투자심사 : 3. 27
- 전략환경영향평가 및 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 시행 : 5. 13

□ 추진계획

○ 2014년

- 전략환경영향평가 및 군계획시설(공공청사) 결정(변경) 용역 : 5.~ 10.
- 농산물 종합가공지원센터 설치 및 운영방안 용역 : 7. ~ 8.
- 농산물 가공창업과정 교육 : 7. ~ 10.
- 공유재산관리계획 협의, 도시계획위원회 심의·승인 등 : 7. ~ 11.
- 건축·가공설비 실시설계 용역 : 9. ~ 12.
- 추가예산 확보 : 1,500백만원(국비 350, 군비 1,150)

○ 2015년 이후

- 농업인대학 ‘농산물 가공창업’과정 개설 : 1월
- 건축 공사착공 및 준공 : 2월 착공, 7월 준공
- 가공기기 설비 : 7. ~ 9.
- 시범운영 및 활성화 : 9. ~

□ 예상 문제점 및 대책

○ 사업부지 군계획시설결정(변경) 기간 소요 사업지연 : 10월 준공

○ 2회 추경 미실시 예상으로 추가사업비 조기확보 애로

⇒ 군계획시설결정(변경) 승인 및 ‘15년 본예산 확보 즉시 입찰 추진
(입찰 ‘15. 1., 공사착공 ‘15. 2. 말, 준공 7.)

○ 농업인의 다양한 가공시설 수요 충족 애로

⇒ 농산물 종합가공지원센터 설치 및 운영방안 용역 시행으로 수요도, 향후 가동률, 판로 등을 고려해 최적의 설비 구축

□ 기대효과

- 창업에서 자립경영 전과정에 걸친 지원으로 창업리스크 최소화
- 체계적인 가공사업 육성으로 지역 농산물 부가가치 창출 및 농가소득 기여

- ◇ 농축산물 직매장 개설로 농가 숙원해소 및 안정적 판매망구축
- ◇ 수도권 소비자 직거래로 수취가격 상승을 통한 농가 소득 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 서울 등 대도시 일원
- 사업기간 : 2016. ~ 2017.(2년간)
- 사업량 : 대도시 직매장 개설 1개소
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17 이후
계	3,500	-	-	3,500	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	-	3,000	-
민자 등	500	-	-	500	-

□ 추진계획

- 2015년 : 대도시 축산물 직매장 장소 선정
- 2016년 : 농축산물 직매장 건물 임차, 건물 리모델링, 예산 확보
- 2017년 : 직매장 개설 인허가 완료 및 운영

□ 예상 문제점 및 대책

- 대도시 농축산물 직매장 국.도비 확보 애로
 - ⇒ 농림사업 지침상 대도시 직매장 개설을 위한 건물 임차비는 없음
 - ⇒ 공모사업을 통한 사업비 확보도 많은 어려움 예상
- 재원 부족으로 인한 군비 확보 애로
 - ⇒ 농업발전기금으로 일부 고정자산 투자(거창군 소유 건물임차)
- ※ 중앙부처 및 경남도와 긴밀한 협의를 통해 국도비 최대한 확보 노력

□ 기대효과

- 대도시 판매망 구축으로 안정적 판매 및 농가 소득 향상 도모
- 소비자 직거래로 브랜드육 가치상승 및 전국 명품 육성 도모

1-3	친환경 한우사료 생산시설 건립	축산내수면
자체사업		940-8132

- ◇ 싹보리 이용 친환경 사료 생산으로 사료비 절감 및 고용창출
- ◇ 친환경 축산물 생산 판매로 애우 브랜드육 가치 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 학리길 560-38번지 일원
- 사업기간 : 2014. 7. ~ 2015. 2.(8개월)
- 사업량 : 싹보리 생산 건물 165m²
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16
계	500	-	500	-	-
국 비	250	-	250	-	-
도 비	30	-	30	-	-
군 비	70	-	70	-	-
민자 등	150	-	150	-	-

□ 추진계획

- 2014년
 - 공모사업 선정
 - 사업 추진 : 2014. 7. ~ 9.
 - 공장 준공 : 2014. 10.
 - 싹보리 생산 : 2014. 11.

□ 기대효과

- 연중 싹보리 생산 시스템 구축으로 친환경 사료생산 용이
- 친환경 사료 공급으로 사료비 절감 및 고급육 생산 도모

1-4	거창 사과·딸기 산업특구 추진	과수담당
자체사업		940-8244

- ◇ 우수한 품질에 비해 낮은 수도권 인지도
- ◇ 지역경제의 중요한 자원으로써의 위상 약화
- ◇ 복합산업화와 수출경쟁력 우위

□ 사업개요

- 사업기간 : 2013.~2017.(5년간)
- 위 치 : 거창군 거창읍 정장리 9번지 외 7,447필지
- 면 적 : 1,526ha
- 사 업 비 : 76,994백만원 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17	임기이후
계	76,994	14,394	14,728	15,359	16,391	16,122	
국 비	12,041	2,101	2,166	2,306	3,051	2,417	
도 비	9,176	1,732	1,734	1,792	1,951	1,967	
군 비	30,330	6,030	6,031	6,157	6,000	6,112	
민자등	25,447	4,531	4,797	5,104	5,389	5,626	

- 사업내용 : 2전략, 5과제, 22특화사업, 76,994백만원
 - **부가가치 창출 전략** : 3과제, 14특화사업, 61,116백만원
 - 고품질생산기반 확충 : 8개 특화사업, 18개 사업, 52,226백만원
 - 가공분야 활성화 : 3개 특화사업, 4개 사업, 1,925백만원
 - 유통기반 확충 : 3개 특화사업, 8개 사업, 6,965백만원
 - **브랜드 가치 및 인지도 제고** : 2과제, 8특화사업, 15,878백만원
 - 명품브랜드 육성 및 홍보 : 5개 특화사업, 11개 사업, 8,349백만원
 - 명소 마케팅 강화 : 3개 특화사업, 6개 사업, 7,529백만원

□ 특구추진 특화사업

추진 전략	추진 과제	특 화 사 업 명	사업량	사업비 (백만원)					
				합 계	기투자	2014	2015	2016	2017
계		22특화사업	47사업	76,994	14,394	14,728	15,359	16,391	16,122
부가 가치 창출	고품질 생산 기반 확충	경쟁력을 갖춘 사과 생산단지 조성	3개사업	34,704	6,100	6,406	6,725	8,061	7,412
		딸기 생산시설 현대화 지원	1개사업	6,100	1,000	1,100	1,200	1,300	1,500
		생산농가 품질향상 지원	4개사업	3,120	542	632	642	642	662
		농가교육 및 컨설팅	2개사업	469	92	92	95	95	95
		천적을 활용한 친환경 생산	2개사업	1,335	265	265	265	270	270
		농업인재 양성	3개사업	788	146	146	146	175	175
		농촌 인력난 해소 사업	2개사업	2,320	456	466	466	466	466
		농작물 재해보험	1개사업	3,390	491	558	669	781	891
	가공분야 활성화	사과생과일주스 연구·생산	1개사업	885	500	90	95	100	100
		가조 음식특화거리 조성 운영	1개사업	780	570	150	20	20	20
		사과·딸기 제품 개발	2개사업	260	-	60	60	60	80
	유통기반 구축	서북부경남 거점산지유통센터 운영	1개사업	3,150	600	600	650	650	650
		로컬푸드 및 직거래 활성화	4개사업	980	180	180	200	205	215
사과·딸기 해외시장 개척		3개사업	2,835	567	567	567	567	567	
브랜 드 가치 및 인지 도 제고	명품 브랜드 육성 및 홍보	사과이용 및 재배 연구	3개사업	4,739	939	940	950	950	960
		거창韓거창 공동브랜드 활용	3개사업	1,600	300	300	300	350	350
		지리적표시 등록	1개사업	140	-	50	50	20	20
		민관협력시스템 구축	1개사업	470	94	94	94	94	94
		특화품 홍보 마케팅 개발	3개사업	1,400	-	600	700	50	50
	명소 마케팅 강화	거창 사과테마파크 운영	2개사업	2,273	451	451	451	460	460
		사과·딸기 체험 연계	3개사업	824	227	107	140	170	180
		거창한마당 대축제	1개사업	4,432	874	874	874	905	905

※ 거창 사과·딸기 산업특구 계획(2013. 9. 4일)에 의거 추진

□ 추진계획

○ 2014년 : 22사업 14,728백만원

- 부가가치 창출 : 14개사업 11,312백만원 (단위 : 백만원)

구 분	사과단지조성	딸기 현대화	품질향상	교육 컨설팅	친환경 생산	인재양성	인력난 해소
사업량	3사업	1사업	4사업	2사업	2사업	3사업	2사업
사업비	6,406	1,100	632	92	265	146	466

구 분	재해보험	사과가공	음식특화	제품개발	APC운영	로컬푸드	해외시장
사업량	1사업	1사업	1사업	2사업	1사업	4사업	3사업
사업비	558	90	150	60	600	180	567

- 브랜드 가치 및 인지도 제고 : 8개사업 3,416백만원 (단위 : 백만원)

구 분	사과이용 및 재배연구	공동 브랜드	지리적 표시	민관 협력	홍보 마케팅	테마파크 운영	사과 딸기 체험	한마당 축제
사업량	3사업	3사업	1사업	1사업	3사업	2사업	3사업	1사업
사업비	940	300	50	94	600	451	107	874

○ 2015년 이후 : 22사업 47,872백만원

- 부가가치 창출 : 14개사업 38,295백만원 (단위 : 백만원)

구 분	사과단지조성	딸기 현대화	품질향상	교육 컨설팅	친환경 생산	인재양성	인력난 해소
사업량	3사업	1사업	4사업	2사업	2사업	3사업	2사업
사업비	22,198	4,000	1,946	285	805	496	1,398

구 분	재해보험	사과가공	음식특화	제품개발	APC운영	로컬푸드	해외시장
사업량	1사업	1사업	1사업	2사업	1사업	4사업	3사업
사업비	2,341	295	60	200	1,950	620	1,701

- 브랜드 가치 및 인지도 제고 : 8개사업 9,577백만원 (단위 : 백만원)

구 분	사과이용 및 재배연구	공동 브랜드	지리적 표시	민관 협력	홍보 마케팅	테마파크 운영	사과 딸기 체험	한마당 축제
사업량	3사업	3사업	1사업	1사업	3사업	2사업	3사업	1사업
사업비	2,860	1,000	90	282	800	1,371	490	2,684

□ 예상 문제점 및 대책

- 딸기 악성노동 해결방안은 고설재배(육묘)이나, 초기 투자비용 과다 소요로 인한 토경 재배농가 고설재배 전환 기피
⇒ 생력화 및 에너지 절감시설 확대지원으로 생산시설 현대화를 통한 고품질 딸기 생산

□ 기대효과

- 사과·딸기 생산시설의 현대화·규모화·전문화 지원을 통한 품질 개선 및 안정적 생산기반 구축
- 더 잘사는 농업 경제육성 및 선진농업 실현

1-5
자체사업

친환경 약초·산채산업 육성

원예특작담당
940-8232

- ◇ 특화품목 오미자 산업을 기반으로 한 약초·산채산업 활성화로 부가가치 향상에 의한 농가소득 증대
- ◇ 서부경남 약초산업 클러스트 구축을 위한 미래성장동력 산업(항노화산업) 기반구축

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 관내 일원
- 사업기간 : 2014.~2018.(5년간)
- 사업량 : 120ha(4~5개 작목)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18
계	10,007	2,765	1,642	1,400	1,400	1,400	1,400
국비	650	650	-	-	-	-	-
도비	1,275	275	200	200	200	200	200
군비	3,461	840	621	500	500	500	500
민자등	4,621	1,000	821	700	700	700	700

□ 추진계획

- 2014년
 - 친환경 오미자 단지조성 : 25ha
 - 오미자 수형개발 및 관수시설 시범사업 : 3개소
 - 약초 대단위 기반조성 사업 : 2작목
 - 천마 재배면적 확대 : 1ha
 - 약초 친환경재배(잡초방지)용 부직포 지원 : 20ha
- ※ 오미자 위주 2~3개 대단위재배 약초품목 도입

○ 2015년 이후

- 친환경 오미자 단지조성사업 지속 추진 : 180 ⇒ 250ha
- 『오미자+4』 약초재배단지 기반조성으로 신성장동력 기반구축 : 2ha
 - 오미자+천마, 도라지, 지황, 하수오 등
- 약초 가공시설 및 체험 활성화
 - 오미자주, 오미자엑기스 등 : 거창원협 등
 - 오미자 체험 행사 등 : 거창오미자영농조합법인
- 거창오미자축제 활성화 : 9.
 - 거창오미자영농조합법인
- 서부경남 약초산업 클러스트(거함산 약초 클러스트) 구축 협의회 개최
 - 산청약초축제 및 함양산양삼축제 통합 운영협의회 구축

□ **예상 문제점 및 대책**

- 약초류 소규모 재배 및 품목의 다양화에 의한 활성화 미흡
⇒ 거창군 약초산업연합회 등 단체별 협의회를 통한 『오미자+4』 대단위 약초재배단지 기반조성
- 사업량 확대 및 지원사업 범위 축소에 따른 예산확보 애로
⇒ 경상남도의 향노화산업 추진계획과 연계한 예산요구
- 약용작물을 이용한 건강식품, 의약품 및 천연물산업이 급성장하고 있으나 유효성, 안정성, 상품성에 대한 우려에 따른 우수 관리 기준 미흡
⇒ 생산물 이력제 및 공동 브랜드화 추진

□ **기대효과**

- 약용작물 자원을 이용한 건강기능식품, 의약품, 화장품 소재 등 1,2,3차 산업 융합한 6차산업 창출
- 고품질·친환경 안전생산에 의한 고부가치 소재개발 및 약초 산업 신성장동력 창출

1-6
자체사업

딸기 유통·가공산업 육성

원예특작담당
940-8234

◇ 거창 특화작목인 딸기 부가가치 창출을 위한 제조·가공 전단계에 필요한 공동생산·저장·유통시설 지원으로 고부가가치 상품생산

□ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 관내일원
- 사업기간 : 2015.~2018.(4년간)
- 사업량 : 1개소
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18
계	3,250	250	750	750	1,500	-
국비	1,500		375	375	750	-
도비	305	125	45	45	90	-
군비	845	125	180	180	360	-
민자등	600		150	150	300	-

□ 추진계획

- 2014년
 - 4계절 딸기 체험·판매관 산업화(봉농원) : 250백만원
 - 스토리가 있는 체험형 찾아오는 농장 조성
 - 딸기 유통·가공산업 육성 세부 실행계획 수립
 - 거창 딸기 유통·가공사업추진단 구성 (산학관연)
 - 딸기재배농가 시설현대화 지원 등으로 안정적 원물공급 체계 구축
- 2015년 이후
 - 공동선별장 (132㎡), 저온저장고(264㎡), 급속냉동시설(132㎡)
 - 딸기 가공시설 : 냉동 딸기시설 및 딸기 슬라이스 시설 등

- 체험시설 : 체험용 하우스 (7,950m²) 설치 - 고설재배시설
- 제품 홍보 및 마케팅 : 사업컨설팅, 홈페이지 구축, 홍보용품 및 가공품 제작, 캐릭터 및 판매 상품 개발 등

□ 예상 문제점 및 대책

- 농가인구 감소 및 농가의 고령화 지속으로 생산량 및 품질저하 우려
⇒ 생력화 및 에너지 절감시설 확대지원으로 생산시설 현대화를 통한 고품질 농산물 생산
- 공동출하보다 개별출하 선호로 품질관리 및 표준화, 공동마케팅 어려움
⇒ 고품질 생산과 가공산업 활성화를 통한 시장 경쟁력 강화로 공선출하, 공동계산 등 유통구조 개선

□ 기대효과

- 비교우위의 딸기산업을 특화하여 고품질 상품성 제고
- 시설딸기 품질향상 및 유통시설 현대화에 의한 경쟁력 강화

수출농업 전략적 육성

- ◇ 기후변화 대비 수출전략 신제품 도입육성으로 저지대 사과농가의 새로운 수출기반을 마련을 통한 수출농업을 육성하고,
- ◇ 극동 러시아 신규시장 개척과 관련 수출품목 다변화에 능동적으로 대응하고 탄력적인 수출촉진 지원 정책으로 신선농산물 수출 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 계속
- 사업량
 - 새로운 수출시장 개척 및 수출 농산물 생산체계 구축
 - 수출 전략품목 육성·지원
 - 수출기반 조성 및 공급체계 구축

○ 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17	'18	임기이후
계	5,928	400	638	1,370	720	800	800	1,200
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	1,454	100	99	375	180	200	200	300
군 비	1,588	100	233	375	180	200	200	300
민자 등	2,886	200	306	620	360	400	400	600

□ 추진계획

- 2014년
 - 수출전략 나디아 식재 : 40여농가, 20ha, 480백만원
 - 극동러시아 수출시장 개척 및 수출업체 지원·육성 체계 구축
 - 선별장 지원 : 600㎡ / 128백만원 (도 39, 군 38, 자 51)
 - 감자 세척시설 지원 : 30백만원 (군 15, 자 15)

○ 2015년 이후

- 새로운 수출시장 개척 및 수출 농산물 생산체계 구축
 - 타켓시장 : 극동러시아 / 농산물 수출 전략적 협조체계 구축
 - 수출목표 : 연간 3,000여톤 (감자, 양파, 양배추, 단무지 등)
 - 생산·수급 체계
 - ┌ 맞춤형 마을기업을 통한 공동생산, 공동출하
 - └ 농협연합사업과 연계한 안정적 물량확보
 - 가격 차별화
 - ┌ 국내 비선호 품위 수출로 전량 판매체계 구축
 - └ 국내 수급량 조절로 가격안정 및 소득증대 유도
 - 수출증대를 위한 교류협약 : 2014. 7 ~ 2015. 6
 - ⇒ 영사관 자문을 받아 교류의향 서신교환, 교류협약 추진
- 수출 전략품목 육성·지원
 - 나 디 아 : 2014년(40농가, 20ha)⇒ 2015(35, 60) ⇒ 2016(55, 90) ⇒ 2018 (150, 100)
 - 신품종 전문농장 유치 : 20ha 내외 / 묘목장, 과수원, 유통시설
 - 수출 유망품목 전략적 육성
 - ※ 사 과 : NB사과 - 시범식재 (연 4농가 2ha), 품종갱신
 - ※ 딸 기 : 매향 수확량 부족 ⇒ 신품종 도입 품종 다변화
 - 나디아 품평회, 농가 교육 및 재배기술 표준화로 생산성 향상
- 수출기반 조성 및 수급체계 구축
 - 저온저장시설 : 500m² / 450백만원 (도 135, 군 135, 자 180)
 - 선별·세척·유통장비 지원 : 200백만원 (도 60, 군 60, 자 80)
 - 농협연합사업과 연계하여 수출 농산물 안정적 수급체계 구축

□ 예상 문제점 및 대책

- 공동생산, 공동출하 등 공동체의식 함양 교육·훈련 체계 미흡
 - ⇒ 공동체의식 함양 교육·훈련체계 구축, 공감대 형성, 참여유도
- 새로운 수출 시장의 검역요건, 금융 신뢰도 등 안전장치 미흡
 - ⇒ 교류협약, 수출보험 가입, 러시아 무역업체 등록 등 조치

□ 기대효과

- 수요와 안정적인 가격을 바탕으로 생산함으로써 농가소득 증대
- 국내 비선호 품위의 농산물 제값 판매로 농가 실질적 소득증대

1-8	농번기 마을단위 공동급식 지원사업	마케팅담당
자체사업		940-8262

- ◇ 농번기 종식준비로 인한 여성농업인의 영농 중단현상 발생
- ◇ 농번기 영농 집중을 통한 농업 생산성 향상 요구

□ 사업개요

- 대상마을 선정기준 : 마을 공동급식 시설(마을회관, 취사시설 포함)을 구비하고 마을당 20명 이상 급식이 가능한 마을
- 지원기준 : 연간 마을 당 1,700천원 지원
 - 조리원 인건비 : 1,000천원
 - 부식 구입비 : 700천원
- 사업량
 - 전체마을 수 : 266개
 - 선정기준 충족마을 : 150개 정도 추정(추후 읍·면 수요조사 후 확정)
- ※ '15년도부터 기준에 충족되는 150개 정도 마을 일괄 지원
- 운 영 : 연중 농번기 25일 이내(마을별 농번기를 감안하여 자율적으로 운영, 연간 2회 정도 분할 운영 가능)
 - 운영주체 : 마을대표
 - 사업완료 후 20일 이내 정산보고 완료
- 사 업 비 : 1,037백만원 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
계	1,037	17	255	255	255	255
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	25	5	5	5	5	5
군 비	1,012	12	250	250	250	250
민자 등	-	-	-	-	-	

※ 2014년 현재 거창읍 모곡마을 외 9개 마을 운영 중

□ 예상 문제점 및 대책

- 공동급식기간 중 식중독 발생우려 : 읍·면장 책임 하에 식중독 예방 등 위생관리와 화재예방 등 안전관리 강화
- 타사업과 혼용하여 통장사용 및 구입시 현금거래로 인한 정산 정확도 저하 : 전용통장개설, 카드사용 등 마을대표 교육으로 보조금 집행의 투명성 확보

□ 기대효과

- 농번기 여성농업인의 근로부담 경감 및 농촌 일손 부족 해소
- 농업집중을 통한 농업생산성 향상 및 농업인의 삶의 질 제고
- 마을 주민들 간 유대감 형성 및 공동체 의식 회복

1-9	농기계임대사업 권역별 확대 설치	농기계관리담당
자체사업		940-8212

- ◇ 임대사업 활성화로 농업인의 실질적인 농업경영비 절감
- ◇ 원거리 농업인들의 농기계임대사업소 이용 편의도모

□ 사업개요

- 권역별 분소설치 예정지 : 북부권역(동부권역, 수송대권역)
 - ※ 북부권역(주상,옹양,고제), 동부권역(가조,가북), 수송대권역(마리,위천,북상)
- 사업기간 : 2014 ~ 2016(계속)
- 사업량 : 농기계임대사업 분소설치(1개소) / 임대농기계 구입
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17
계	1,400	-	200	1,000	200
국비	500	-	-	500	
도비	150	-	-	150	
군비	750	-	200	350	200

□ 추진계획

- 2014년
 - '16년 농기계임대사업 추가신설 사업신청
 - 10억(국비 5억, 도비1.5억, 군비 3.5억)
 - 농기계 보관창고 신축
 - 임대농기계 및 관리장비 구입
 - '14년 9. - 부지매입 예산확보(군비)
- 2015년 이후
 - '16. 1. ~ 12월경 세부사업 계획에 따라 사업추진
 - '17. 이후 매년 2억 정도의 예산 확보를 통해 신기종 임대 농기계 구입 추진

□ 예상 문제점 및 대책

○ 문제점

- 분소설치 권역선정에 대한 핼비(PIMFY)현상 발생가능
- 임대사업 운영에 따른 인력 부족

○ 대책

- 임대사업의 수요증가 및 효율성 등을 검토하여 추가신설 추진
- 분소 신설에 따른 농기계 전문인력 단계적 확보

□ 기대효과

- 원거리에 농작업지가 있어 농기계임대사업소 이용에 불편을 겪어왔던 농업인의 불편해소
- 농기계 공동이용률 제고를 통해 농업인의 농업경영비 부담경감

- ◇ 거창 맞춤형 마을만들기는 기존 획일화된 마을만들기 사업을 지원하는 것이 아닌, ‘언제, 어떤상황에서도, 누구나’ 에게 열린 수요자 중심의 맞춤형 마을만들기를 추구하며, 주민(사람)과 마을(공간), 일거리(경제)와 문화를 통합적으로 작동할 수 있도록 지원하는 것을 기본 방향으로 추진
- ◇ 맞춤형 마을만들기 및 농촌형 마을만들기의 기본 주축이 되는 농업 소득 증대를 위한, 로컬푸드 산업 활성화를 위한 생산, 가공 등 ‘맞춤형 마을기업’을 거창군의 마을만들기 대표 모델 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 전역
- 사업기간 : 2014. ~ 2017.
- 사업량 : 50개마을 시설지원(비닐하우스 등)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17
군비	2,000	440	80	480	480	480

□ 추진계획

- ‘맞춤형 마을기업’ 조성
 - 거창 맞춤형 마을만들기의 기본 모델인 맞춤형 마을기업 조성
 - 로컬푸드를 통한 소득증대를 기본으로 추진하되, 마을별 특성에 따른 맞춤형 마을만들기 지원
 - 로컬푸드[맞춤형 마을기업(소득증대)] + 문화·복지 + 귀농·귀촌 + 마을개발 + 도농교류 ⇒ 연계 6차 산업 활성화
- 연도별 추진 계획 (단위 : 개소, 백만원)

계	기추진	2014년	2015년	2016년	2017년
50개소	11	2	13	12	12
2,000	440	80	480	480	480

○ 사업추진절차

(1단계) 맞춤형 마을기업 대상마을 컨설팅 진행

(2단계) 마을선정 / 마을기업 운영계획서 검토

(3단계) 맞춤형 마을기업 사업 실행

(4단계) 모니터링 지원

(5단계) 기업확대 지원 / CB 등 사업과 연계하여 비즈니스 모델화

○ 맞춤형 마을기업 생산 농산물에 대한 판로 확보

- 농산물 순회수집, 직거래 장터, 푸드종합센터, 외갓집 밥상꾸러미, 학교 급식 등을 통한 판매망 확보, 수입 보장

□ **예상 문제점 및 대책**

○ 리더 경험 부족, 농가 간 갈등, 사업지연 등 사업추진 난항

- 마을사업 준비 부족의 문제를 해결하기 위하여, 사업 진행 전 리더아카데미 등을 통한 리더양성교육과, 사업 진행 중 주민 교육, 현장포럼 지속 진행으로 마을화합, 활성화 도모

○ 전략품목에 대한 재배 권장, 하우스 일변도로 다양성 떨어짐

- 전략품목 및 사업 내용에 대한 다양화 지원 방안 강구

○ 마을 특성상 맞춤형 마을기업 진행이 어려운 마을에 대한 지원

- 마을 여건, 주민 요구에 맞춰 문화복지 공동체, 스토리 있는 마을 등 여건에 맞는 맞춤형 마을만들기로 소외되는 마을 없도록 연계 지원

□ **기대효과**

○ 로컬푸드를 통한 생산적 복지의 실현

○ 주민들에게 일하는 즐거움, 경제적 자립, 행복한 미래 설계

○ 맞춤형 마을만들기를 통한 인구 유입과 거창 맞춤형 마을만들기 활성화를 통한 경남 서북부 중심지의 기능강화, 도시위상 제고

13. 보건소

산후 조리원 설치

◇ 분만취약지지원사업의 선정·운영과 연계한 산후 조리원 설치로
임산부의 관외 산후조리원 이용에 따른 불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 거창적십자병원 내
- 사업기간 : 2014. ~ 2016.
- 사업량 : 1개소
- 설치규모 : 200㎡(10실)
 - 거창적십자병원 주차타워 설치 후 증축으로 설치
 - 산모조리실 7실, 신생아실 1실, 공동이용실, 휴게실 등
- 소요인력 : 9명(간호사1,조무사4,산모도우미1,영양사1,조리사2)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17 이후
계	500		500		
국 비	500		500		

□ 추진계획

- 2014년(기 추진 사항)
 - 국비 확보를 위한 중앙부처 방문 : 2회
 - ▶ 보건소장 외(거창적십자병원 총무과장 동행) : 2014. 4. 23
 - ▶ 부군수, 예산담당주사 등 : 2014. 5. 27
 - 보건복지부 : 기획재정부로 사업비 신청(총액 42억원) : 2014. 6.
- 2014년도 하반기
 - 거창적십자병원 사업계획서 제출 : 2014. 8월경
 - 국립중앙의료원 공공보건의료사업지원단심사 : 2014. 9월경
 - 대한적십자사 본부에서 심사결과 통보 : 2014. 10월경

○ 2015년 이후

- 대한적십자사 본부에서 국비 교부 : 2015. 4월경
- 거창적십자병원에서 사업 착수 : 2015. 5월경
- 산후조리원 설치 완료 : 2015. 12월경

□ **예상 문제점 및 대책**

- 보건복지부에서는 기존 사설 산후조리원의 비위생적 관리문제가 대두되어 공공산후조리원 설치를 권장하지 않고 있는 실정임
- 거창적십자병원 산후조리원 설치·운영 시 수시 확인점검을 통하여 산모·신생아 감염사고 발생 사전예방 철저 이행

□ **기대효과**

- 관외 원정 분만으로 인한 군민의 사회 경제적 부담 완화
- 출산분위기 확산 및 관내 분만을 제고

2-11
자체사업

소아과 진료시간 연장 시행

예방의약담당
940-8331

- ◇ 병원급 소아청소년과 진료 대기시간 지연으로 대도시 원정 진료
- ◇ 소아과 진료시간 연장 필요성 대두 및 군민들의 요구 증가

□ 사업개요

- 대 상 : 거창적십자병원(공공의료기관)
- 사업기간 : 2014. 7. 1. ~
- 사업량
 - 소아과 진료시간 연장(18:00 → 21:00(3시간 연장))
 - 인건비 지원 : 전문의 1명(진료1명 → 2명)
- 사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총 액	'14	'15	'16	'17	'18
군 비	720	-	180	180	180	180

※ 소아과 환자 대도시 유출실태 분석 : 따로붙임

□ 추진계획

- 2014년도
 1. 거창군 인구증가 지원조례 개정 : 지원근거 마련
 - 2014년 하반기내에 개정 : 기획감사실 협조
 - ※ 조례 검토 후(개정 불가시) : 소아과 지원 조례 제정
 2. 예산확보 : 2015년 본예산
- 2015년 이후
 1. 예산지원 : 180백만원 → 매년
 2. 예산지원에 따른 사업성과 모니터링 : '15. 12.

□ 예상 문제점 및 대책

- 소아청소년과 전문의 지방근무 기피로 의사 구인에 애로
 - 특히 야간근무조건으로는 더욱더 어려울 것으로 판단
- 탄력적 근무시간 조건 부여 : 2명 교대
 - 09:00 ~ 18:00, 13:00 ~21:00 : 주1회 교대 근무
- 민간경상보조금(운영비 지원 등) 예산 편성이 어려움
- 2015년 예산편성시 예산담당 부서 협조

□ 기대효과

- 소아과 진료시간 연장으로 직장맘에 대한 보육부담 경감
- 대도시 원정 진료 감소로 군민들의 경제적비용 절감

- ◇ 보건부문에 국한되어 있던 건강문제를, 지역의 물리적·사회적 자원을 창출하고 개선하여 해결하려는 공공정책 필요
- ◇ 쾌적한 도시환경으로 주민들의 건강과 삶의 질 향상 및 우리군 국제적 위상 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 일원
- 사업기간 : 2014 ~ 2015.
- 사업량 : 1식
- 사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총 액	기 투자	'14	'15	'16	'17
계	100	0	53	15	15	17
국 비						
도 비						
군 비	100	0	53	15	15	17
민자 등						

□ 추진계획

- 2014년
 - 건강도시 추진개발 연구 용역
 - ▶ 계 약 : 2014. 5. 16. / 착 수 : 2014. 5. 22.
 - ▶ 계약자 : 고신대학교 산학협력
 - ▶ 중간보고 2014. 8. 12 / 완 료 : 2014. 11. 15.
 - 대한민국건강도시협의회 및 WHO 건강도시 연맹 가입 신청
 - ▶ 대한민국건강도시협의회 : 2014. 7.까지
 - ▶ WHO 건강도시 연맹 : 2014. 8.까지
 - WHO 건강도시 연맹 가입 인증서 수여 : 2014. 10. 31일한

○ 2015년 이후

- 건강도시 사업추진 실무팀 구성·운영
- 분야별 건강도시 만들기 프로그램 개발 및 시행
- 건강도시 워크숍 및 세미나 개최

□ **예상 문제점 및 대책**

- 건강도시사업의 원활한 추진은 거창군 전 부서간의 긴밀한 협조 체계 필요
⇒ 부서장 포함하여 전 직원 대상 건강도시 이해 교육 실시로 공감대 형성
- 건강도시사업 추진을 위한 전담조직 및 인력 부재
⇒ 건강도시사업 추진 전담조직(건강도시담당)을 본청 또는 보건소에 신설

□ **기대효과**

- 국 내·외 건강도시 네트워크 활동의 기반 마련
- 우리군의 국제도시 부각으로 민선 6기 군정비전 실현

14. 상하수도사업소

7-3	거창읍 처리구역 하수관거 정비	하수도담당
자체사업		940-8431

◇ 거창읍 처리구역(강북, 강남 및 강동분구)은 합천댐 상류 및 상수원 보호구역으로서 하수관거 미정비 및 노후로 생활하수가 합천댐으로 직접 유입되어 수질을 악화 시키고 있어,
 ◇ 수질개선과 수질오염 방지를 위해 하수관거 정비가 시급한 실정

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 거창읍 김천, 대평, 양평, 동변, 학리 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년간)
- 사업량 : 하수관거설치 L=11.8km, 배수설비 1,000개소
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17
계	6,000	-	714	2,286	3,000
국비	4,200	-	500	1,600	2,100
도비	1,080	-	121	419	540
군비	720	-	93	267	360
민자등	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 2014. 10 : 2015년 사업예산 확보
- 2015. 01 : 계약심사 및 재원 협의
- 2015. 03 : 착 공
- 2017. 12 : 완 공

□ 예상 문제점 및 대책

- 도심지 공사로 인한 주민 통행불편 및 영업에 따른 민원 예상
 ⇒ 실시설계 시 주민설명회 개최 및 지속적인 홍보로 민원 해소

□ 기대효과

- 주거환경의 개선 및 방류 수역의 수질개선
- 쾌적한 도시환경 조성

마을 하수도 설치 확대

◇ 소규모 마을 하수처리시설을 확충하여 방류 수역의 수질개선과 주민보건 및 복지향상 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 거창군 일원
- 사업기간 : 2013. ~ 계속
- 사업량 : 처리장 39개소, 하수관거설치 L=138.2km, 배수설비 4,545개소
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	'14	'15	'16	'17	'18	압박후
계	147,987	61,401	2,181	-	3,417	4,430	2,857	74,129
국비	108,475	47,809	1,284	-	2,391	3,101	2000	51,890
도비	14,474	1,299	449	-	513	665	429	11,119
군비	25,038	12,293	448	-	513	664		11,120
민자등	-	-	-	-	-			

□ 추진계획

- 2014. 10 : 거창군 하수도정비기본계획 변경 계약심사
- 2014. 11 ~ 2015. 10 : 착공 및 준공
- 2015. 03 : 2016년 사업 신청(환경부)
- 2016. 01 : 거창군 하수도정비기본계획 변경승인 요청(환경부)

□ 예상 문제점 및 대책

- 대부분의 마을들은 인구수의 감소로 오수발생량이 적어 사업 경제성이 없고, 1일 시설용량 50m³이상, 500m³ 미만을 기준으로 사업비를 지원하고 있어 사업추진 애로
 - ⇒ 규모가 작은 마을은 인근마을과 연계처리 및 처리구역 확대 등으로 사업추진이 가능하므로 연계처리 및 처리구역 확대를 위해 '15년도에 거창군하수도 정비기본계획을 변경하여 단계별 사업 추진

□ 기대효과

- 합천댐 상류 지역의 하수관거 정비로 방류 수역의 수질개선
- 생활환경 개선 및 주민의 보건위생 증진

15. 체육청소년사업소

- ◇ 스포츠파크 내 기존 체육관 노후화 및 공간협소로 체육활동 환경이 열악한 실정임
- ◇ 실내체육관 신규 건립을 통하여 스포츠파크 체육인프라 구축 및 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 거창군 거창읍 심소정길 39-36(스포츠파크 내)
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.(5년간)
- 사업량 : 체육관 건립(지상3층 9,000㎡ 정도)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17	'18
계	28,000	200	1,300	8,830	8,830	8,840
국비	11,200			3,730	3,730	3,740
도비	3,360			1,120	1,120	1,120
군비	13,440	200	1,300	3,980	3,980	3,980
민자등	0					

□ 추진계획

- 2014년
 - 기본계획 및 타당성 조사 용역('14. 9.~'15. 3.)
- 2015년 이후
 - '15. 3.: 지특예산 신규사업 신청
 - '15. 4. ~ '16. 2. : 실시설계 용역 및 인허가 완료
 - '16. 3. ~ '18. 3. : 공사착수 및 준공

□ 예상 문제점 및 대책

- 지특회계(도 자율)예산으로 막대한 사업비가 소요되는 사항이나 최근 계속사업에 대한 사업비 투자로 인하여 신규사업 반영이 어려운 여건임
⇒ 사업의 필요성에 대하여 지속적인 홍보와 설득

□ 기대효과

- 다목적 실내체육관 신규건립을 통한 다양한 체육활동 인프라 구축 및 생활체육 활성화 도모

4-7
자체사업

국민체육센터 볼링장 설치

체육시설담당
940-8732

- ◇ 거창에 하나밖에 없는 볼링장이 도시계획사업 편입예정(사업중단)
- ◇ 국민체육센터 내 볼링장 설치하여 다양한 체육 인프라 구축 및 볼링 동호인의 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 경남 거창군 거창읍 심소정길 39-36(스포츠파크 내)
- 사업기간 : 2014. ~ 2015.(2년간)
- 사업량 : 볼링장 설치
 - 국민체육센터 옥상증축 1,115㎡
 - 볼링장 설치(10레인) 및 부대시설 설치 등
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총액	'14	'15	'16	'17 이후
계	1,960	900	1,060	0	0
국비	744	200	544		
도비	330	150	180		
군비	886	550	336		
민자 등	0				

□ 추진계획

- 2014년
 - '14. 1.~'14. 3. : 구조안전진단 용역 시행(조건부 적합판정)
 - '14. 3.~'14. 8. : 실시설계용역 시행 및 실시계획 인가
 - '14. 9.~'14. 10. : 계약심사 및 착공
- 2015년 이후
 - '15. 10.~'15. 12. : 공사준공 및 개장

□ 예상 문제점 및 대책

- 구조안전진단 결과 2층 부분에 대한 경미한 구조보강(6,400천원 소요) 시행
⇒ 실시설계 반영을 통한 구조보강 시행

□ 기대효과

- 불링 동호인(240명)의 건의사업 해소
- 체육인프라 구축 및 도 단위 대회 등 유치가능

4-8
자체사업

국제 파크골프대회 유치

체육시설담당
940-8732

- ◇ 도단위 이상 체육행사 유치로 우리군을 적극적으로 알리고, 체육대회 참가 유동인구 증가로 경제적 유발효과 거양
- ◇ 한·일 생활체육 국제교류(경상남도&일본 북해도) 활성화에 참여

□ 대회개요

- 대 회 명 : 2014년 제1회 생활체육 경상남도지사배 국제파크골프대회
- 대회기간 : 2014. 10. 4.(토) ~ 10. 6.(화)
- 장 소 : 거창읍 양평리 1125번지 실버레포츠타운 일원
- 주 최 : 경상남도, 경상남도생활체육회, 거창군
- 주 관 : 경남파크골프연합회, 거창파크골프연합회
- 참가인원 : 15개국, 450명 내외
- 사 업 비 : 50백만원(도비 10, 시군비 20, 자체 20)

□ 추진계획

- 대회 개최관련 협의 : 2014. 7.
- 실버레포츠타운 대회장소 우선 시공 : 2014. 9.한
 - 잔디식재 : 2014. 6. 현재 100% 완료
 - 수목식재 : 2014. 6. 현재 100% 완료
- 대회장 및 환영식장 정비 : 2014. 9월한

□ 예상 문제점 및 대책

- 국제대회 유치비 및 행사비 부담 발생
 - ➔ 도비확보, 유치 시기, 규모의 적절한 조절로 투입비용 최소화
- 체육시설 및 기반시설(음식, 숙박 등) 취약
 - ➔ 관련 부서와 유기적 협조체제

□ 기대효과

- 군민 여가문화 활성화 및 건강 증진
- 스포츠를 활용한 우리군의 브랜드 가치 제고
- 국제대회 유치로 유동인구 유입에 의한 경제적 효과 창출
